



وزارة المالية
الديوان العام
الوارد ١٨٣٣٤
التاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٠ الوقت ١٥:٠٢
يحول إلى مديرية الخزينة العامة

وزارة الأشغال العامة والإسكان



٢٥٢٠٨

٢٠٢٠/١٧

الرقم

٢٠٢٠-٠٨-٢٥

التاريخ

الموافق

عطوفة امين عام وزارة المالية

الموضوع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٧) الخاص بتنفيذ  
ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري ساحة  
المناولة Back to back الجزء الثاني .

اشارة الى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٩٦٥٠/١/١٣/١٠ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ بخصوص تأمين  
المخصصات المالية اللازمة لأعمال تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري.

أرفق لعطوفتكم اصل المطالبة المالية رقم (١) على حساب أعمال العطاء موضوع البحث للسادة  
شركة المشاريع المتحدة والبالغ قيمتها (١٣٣١٣٩٧.٩٣٠) فقط مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة  
وسبعة وتسعون ديناراً وقلد ٩٣٠ ساً من قيمة العطاء لمذكور أعلاه.

راجياً عطوفتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بصرفها لصاحب الاستحقاق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
المهندس مروان خالد الجمعاني  
مدير ادارة الشؤون المالية والادارية  
م. جميل المشاقبة

السيد / ...  
...  
...

نسخة: لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية  
نسخة: لمدير الشؤون المالية  
نسخة: للسادة شركة المشاريع المتحدة  
المرفقات: اصل مسند الصـرف  
اصل المطالبة المالية



وزارة الأشغال العامة والإسكان

وزارة المالية  
الديوان العام  
الوارد 13215  
التاريخ 2020/07/02 الوقت 09:58  
يحول إلى مديرية الأشغال العامة والإسكان

١٨٣٠٦

٢٠٢٠ / ١٦

٢٠٢٠-٠٧-٠٢

رقم

التاريخ

الموافق

معالي وزير المالية

الموضوع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٦) الخاص  
بتنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز  
حدود العمري

اشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٠٢) في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠ والوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٩٦٥٠/٦/١٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢ بخصوص تكليف معالي وزير المالية بتوفير المخصصات اللازمة للقيام بأعمال انشاء وتجهيز ساحة المناولة التبادلية في مركز حدود العمري بقيمة بكلفة تقريبيه تبلغ (٣١٠٠٠٠) فقط ثلاثة ملايين ومائة الف دينار .

ارفق لمعاليتكم اصل المطالبة المالية رقم (١) على حساب اعمال العطاء موضوع البحث للساده شركة حسان الكوز واولاده والبالغ قيمتها الاجمالية (٩٦١٨٠٩.٦٩٥) فقط تسعمائه وواحد وستون الفاً وثمانمائه وتسعة دنانير وفسلساً ٦٩٥ .

راجياً معاليتكم التكرم بالموافقة والايجاز لمن يلزم لصرفها لاصحاب الاستحقاق حسب الاصول واعلامنا في حال صرفها من قبلكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان  
المهندس فلاح عبدالله العموش

المهندس فلاح عبدالله العموش  
٢٣  
٧/١٢

نسخة : لعطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
نسخة : لمدير ادارة الشؤون المالية والإدارية  
نسخة : لمدير تنسيق الطرقات  
نسخة : لمدير الشؤون المالية



معالي وزير الأشغال العامة والإسكان

الموضوع: العطاء رقم (2020/16) الخاص  
بتنفيذ ساحات التباعد  
التجاري في مركز حدود العمري

إشارة إلى كتاب معاليكم رقم 18306/2020/16 تاريخ 2020/7/2  
ومرفقاته بخصوص صرف المطالبة رقم (1) على حساب أعمال العطاء موضوع  
البحث للسادة شركة حسان الكوز وأولاده والبالغ قيمتها الإجمالية (961,809)  
تسعمائة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة دنائير و (695) فلساً لتجهيز ساحة  
المناولة التبادلية في مركز حدود العمري .

أرجو ان ارفق لمعاليكم بطيه التحويل المالي رقم (15789) تاريخ  
2020/7/19 الصادر بأسم معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بالإضافة لوظيفته  
وبقيمة (961,809) تسعمائة وواحد وستون ألف دينار وثمانمائة وتسعة دنائير و  
(695) فلساً والذي يمثل قيمة المطالبة المبيّنة اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

وزير المالية  
د. محمد محمود العسوس

نسخة: مدير مديرية الخزينة العامة / المصنف

2020.م.ع.4/44

السيد المصنف  
  
2/19



## مستند صرف (مدفوعات أخرى)

### قسم الرديات والمصرفات المستردة

المستفيد		اسم المستفيد	معالي وزير الاشغال العامة والاسكان بالاضافة لوظيفته	الرقم	210100001
المورد		ملاحظات	رقم الضريبي	رقم الحساب	
البيان		عطاء تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (لمواجهة مرض كورونا)	رقم فاتورة المورد	طريقة الدفع	الشيك
رقم فاتورة المستفيد		اشغال/سلفة	ت. فاتورة المورد	2020/07/16	
النوع		دفعة مقدمة - سلف مؤقتة	العملة	دينار أردني	1
الرقم الآلي		467	ت. إدخال الفاتورة	2020/07/16	ت. الأستاذ العام
الحالة		متاح	مرجع المستند		
رقم أمر الشراء		رقم الإلتزام	0.00		

### المستحقات

البيان	الرمز الحسابي الوصف: توازن/الجغرافي/ الوظيفي/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	المبلغ	
		أجنبي	محلي دينار فلس
عطاء تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (لمواجهة مرض كورونا)	100000/150116005/6218035001/000000000/00000/110100/6212 حساب السلف المصروفة/نفقات	0	961809 695
(إجمالي المستحقات بالحروف): فقط تسعمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وتسعة دنانير وستمائة وخمسة وتسعون فلس لا غير		0.000	961809 695

### الإقتطاعات، المستردات

البيان	الرمز الحسابي الوصف: توازن/الجغرافي/ الوظيفي/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	المبلغ	
		أجنبي	محلي دينار فلس
(إجمالي الإقتطاعات بالحروف): فقط صفر دينار لا غير			0 000
صافي المستحقات	فقط تسعمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وتسعة دنانير وستمائة وخمسة وتسعون فلس لا غير	0.000	961809 695

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الصرف قد تم وفقا للتشريعات المالية:

إسم المفوض بالإنتفاق: .....

إسم المنظم وتوقيعه: ..... توقيعه: .....

دقق فوجد مطابقا للتشريعات المالية  
المصدق ومحول لأمين صندوق ..... للصرف.  
وحدة الرقابة الداخلية: .....  
التاريخ: ..... التاريخ: .....  
الإسم والتوقيع: ..... الإسم والتوقيع: .....

رقم الشيك: 15789 رقم الصرف: .....

إسم وخاتم أمين الصندوق: 9861028466

الرقم الآلي: 467 تاريخ الصرف: 2020/07/19





وزارة المالية
الديوان العام
الوارد ١٨٣٣٤
التاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ الوقت ١٥:٠٢
يحول إلى مديرية الخريجة العامة

وزارة الأشغال العامة والإسكان

الرقم ..... ٢٠٢٠/١٧  
التاريخ ..... ٢٠٢٠-٠٨-٢٥  
الموافق .....

### عطوفة امين عام وزارة المالية

الموضوع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٧) الخاص بتنفيذ  
ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري ساحة  
المناولة Back to back الجزء الثاني .

اشارة الى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٩٦٥٠/١/١٣/١٠ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ بخصوص تأمين  
المخصصات المالية اللازمة لأعمال تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري.

أرفق لعطوفتكم اصل المطالبة المالية رقم (١) على حساب أعمال العطاء موضوع البحث للسادة  
شركة المشاريع المتحدة والبالغ قيمتها (١٣٣١٣٩٧.٩٣٠) فقط مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة  
وسبعة وتسعون ديناراً وقلد ٩٣٠ ساً من قيمة العطاء لمذكور أعلاه.

راجياً عطوفتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بصرفها لصاحب الاستحقاق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
المهندس مروان خالد الجمعاني  
مدير ادارة الشؤون المالية والادارية  
م. جميل المشاقبة

سيد رزق لتقاسم  
٢٠٢٠

نسخة: لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية  
نسخة: لمدير الشؤون المالية  
نسخة: للسادة شركة المشاريع المتحدة  
المرفقات: اصل مسند الصـرف  
اصل المطالبة المالية

الملصقة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٨٠٣٨٠٣ +٩٦٢ ٦ فاكس: ٥٨٥٧٥٩٠ +٩٦٢ ٦ ص.ب: ١٢٢٠٠٠ عمان ١١١١٨ الأردن. البريد الإلكتروني: mpwh@mpwh.gov.jo



رقم الصرف: شهر  
المركز: التاريخ  
رقم التادية:

الدائرة: (رقما وكتابة)  
الفصل:  
البرنامج:  
رقم الماد (رقما وكتابة)  
المادة:

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة المالية

مستند صرف النفقات

(الاسم من ثلاثة مقاطع والعنوان بالكامل)

مطلوب الي: شركة الخارج المتحدة

البيان	المبلغ بالعملة الأجنبية		العدد الكمية	السعر والبدل	المبلغ	
	دينار	فلس			دينار	فلس
حد ذلك منحة المطالبة (الاول) على حساب العطاء ١٤١٠/٢٠٠٤ المسند بمنفذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدودنا إعادة المناقشة Back-Back جزء ثاني				٩٣	١٣٣١٢٤٧	
المجموع فقط مليون وثلثمائة الف وثلثمائة وستة وثمانون ديناراً فقط				٩٣	١٣٣١٢٤٧	

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الاتفاق قد تم وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة  
اسم المفوض بالاتفاق

اسم المنظم وتوقيعه: *محمد أبو حمزة*

توقيعه:

دقق فوجد مطابقاً للتشريعات المالية. مصدق ومحول أمين صندوق. الصرف

سجل تحت رقم:

التاريخ:

٢٠٠٤ / ١٨ / ٢٠٠٤

التاريخ:

الاسم والتوقيع:

الاسم والتوقيع: *محمد أبو حمزة*

الاسم والتوقيع:

وصلني مبلغ: ديناراً

رقم الشيك:

تاريخه:

وزارة المالية  
مصلحة الرقابة المالية  
قسم الرقابة المالية  
الاسم والتوقيع: *محمد أبو حمزة*  
التاريخ: *٢٠٠٤ / ١٨ / ٢٠٠٤*

نوع الاقطاع	الاقطاعات	
	دينار	فلس
طوابق مكتب	١٩٩٧	١٠٠
مطالبة فراه	١	٥٠
مخزونة من حسابات الاستشاري	٢٧	٤٤١
المجموع	٢٠٠٥	٤٤١

أشاد وسعيوب  
انفا *محمد أبو حمزة*



رئاسة الوزراء

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

وزارة المالية  
الديوان العام  
الوارد 8882  
التاريخ 2020/05/13 الوقت 12:15  
يحول إلى معالي وزير المالية



رقم ..... ٩٦٥٠ / ١ / ١٣ / ١٠  
تاريخ ..... ١٤٤١ / رمضان / ١٩  
وافق ..... ٢٠٢٠/٥/١٢

معالي وزير الأشغال العامة والإسكان

أشير إلى كتابكم رقم ١٣٢٢٥/١/١٨/٤ تاريخ .....  
٢٠٢٠/٥/١٠

بناء على تنسيب معاليكم، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  
٢٠٢٠/٥/١٠ - بالاستناد لأحكام المادتين (٤٩/د، ٥٠/د) من نظام المشتريات الحكومية  
رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ - الموافقة من حيث المبدأ على ما يلي:-

١. مفاوضة وتلزيم المقاولين كل من (شركة حسان الكوز وأولاده، وشركة المشاريع  
المتحدة) للقيام بأعمال إنشاء وتجهيز ساحة المناولة التبادلية في مركز حدود العمري  
المبينة تفاصيلها في التقرير الفني المرفق بكتاب معاليكم المشار إليه أعلاه، بكلفة  
تقريبية تبلغ (٣,١٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار شاملة جميع الضرائب  
والرسوم، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال خلال مدة أقصاها شهر من  
التلزيم.

٢. تلزيم المكتب الهندسي الاستشاري العالمي أعمال الإشراف على تنفيذ الأعمال أعلاه  
بقيمة إجمالية لا تزيد على (٢٠٠,٠٠٠) عشرين ألف دينار شاملة جميع الضرائب  
والرسوم.

٣. استكمال الإجراءات اللازمة وفق النظام أعلاه أصولياً.

٤. تكليف معالي وزير المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية.

واقبلوا فائق الاحترام.

رئيس الوزراء

المدير العام  
دائرة المشتريات الحكومية

نسخة/إلى معالي وزير المالية  
نسخة/إلى معالي وزير المالية/ المشتريات الحكومية  
نسخة/إلى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة  
نسخة/إلى عطوفة أمين سر مجلس الوزراء  
قرار رقم (٩٣٠٢)  
٥/١١/٢٠



وزارة المالية
الديوان العام
الوارد ١٨٣٤
التاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ الوقت ١٥:٠٢

يحول إلى مديرية الخريجه العامه

وزارة الأشغال العامة والإسكان



٢٥٢٠٨

٢٠٢٠/١٧

الرقم

٢٠٢٠-٠٨-٢٥

التاريخ

الموافق

عطوفة امين عام وزارة المالية

الموضوع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٧) الخاص بتنفيذ  
ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري ساحة  
المناولة Back to back الجزء الثاني .

اشارة الى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٩٦٥٠/١/١٣/١٠ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ بخصوص تأمين  
المخصصات المالية اللازمة لأعمال تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري.

أرفق لعطوفتكم اصل المطالبة المالية رقم (١) على حساب أعمال العطاء موضوع البحث للسادة  
شركة المشاريع المتحدة والبالغ قيمتها (١٣٣١٣٩٧.٩٣٠) فقط مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة  
وسبعة وتسعون ديناراً و٩٣٠ ساً من قيمة العطاء لمذكور أعلاه.

راجياً عطوفتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بصرفها لصاحب الاستحقاق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

امين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
المهندس مروان خالد الجمعاني  
مدير ادارة الشؤون المالية والادارية  
م. جميل المشاقبة

سيد زينة الشقار  
١٤٦

نسخة: لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية  
نسخة: لمدير الشؤون المالية  
نسخة: للسادة شركة المشاريع المتحدة

المرفقات: اصل مسند التصرف  
اصل المطالبة المالية

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٨.٢٨.٢ +٩٦٢ ٦ فاكس: ٥٨٥٧٥٩٠ +٩٦٢ ٦ ص.ب ١٢٢. عمش ١١١١٨ الأردن. البريد الإلكتروني: mpwh@mpwh.gov.jo



وزارة المالية
الديوان العام
الوارد ١٨٣٣٤
التاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ الوقت ١٥:٠٢
يحول إلى مديرية الخريجة العامة



٢٥٢٠٨

٢٠٢٠/١٧

الرقم

٢٠٢٠-٠٨-٢٥

التاريخ

الموافق

عطوفة امين عام وزارة المالية

الموضوع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٧) الخاص بتنفيذ  
ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري ساحة  
المناولة Back to back الجزء الثاني .

اشارة الى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٩٦٥٠/١/١٣/١٠ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ بخصوص تأمين  
المخصصات المالية اللازمة لأعمال تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري.

ارفق لعطوفتكم اصل المطالبة المالية رقم (١) على حساب أعمال العطاء موضوع البحث للسادة  
شركة المشاريع المتحدة والبالغ قيمتها (١٣٣١٣٩٧.٩٣٠) فقط مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة  
وسبعة وتسعون ديناراً وقلد ٩٣٠ ساً من قيمة العطاء لمذكور أعلاه.

راجياً عطوفتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بصرفها لصاحب الاستحقاق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

امين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
المهندس مروان خالد الجمعاني  
مدير ادارة الشؤون المالية والادارية  
م. جميل المشاقبة

السيد رنة لتقارب  
١٤٦

نسخة: لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية

نسخة: لمدير الشؤون المالية

نسخة: للسادة شركة المشاريع المتحدة

المرفقات: اصل مسند الصـرف

اصل المطالبة المالية



المملكة المغربية

مستند صرف النفقات

رقم الصرف: شهر: المركز: رقم التادئة: التاريخ:

الدائرة: (رقما وكتابة) الفصل: البرنامج: المشروع: (رقما وكتابة) المادة:

وزارة المالية

(الاسم من ثلاثة مقاطع والعنوان بالكامل)

مطلوب الى: مركزه التاريخ المتجره

البيانات	المبلغ بالعملة الأجنبية		العدد الكمية	السعر والتبدل	المبلغ	
	دينار	فلس			دينار	فلس
حذرت نسبة المالية الاول على حساب العطاء ١٢٠٠٠ / ١٠ / ٢٠١٥				٢٢٥	١٢٣١٢٩٤	٩٣
المعاد بمنفذ ساحات الشارل التجاري في مركز هودو الذي اذنته الشركة Past Back جزو تاريخ					١٢٣١٢٩٤	٩٣
المجموع فقط					١٢٣١٢٩٤	٩٣

Handwritten notes and stamps on the table, including a large signature and 'التوقيع'.

اصدق على صحة البيان المذكور اعلاه واشهد ان الاتفاق قد تم وفقا لاحكام قانون الموازنة العامة اسم المفوض بالاتفاق

اسم المنظم وتوقيعه: اسم المندوب وتوقيعه:

دقق فوجد مطابقا للتشريعات المالية. مصدق ومحول لأمين صندوق. المصرف:

سجل تحت رقم:

التاريخ: ٢٠١٥ / ١٠ / ٢٠

الاسم والتوقيع: الاسم والتوقيع:

وصلني مبلغ: ديناراً

رقم الشيك:

تاريخه:

Handwritten notes and stamps from 'وزارة المالية' and 'الرقابة المالية', including 'اسم وتوقيع المستلم' and 'اسم وخاتم أمين الصندوق'.

نوع الاقطاع	الاقطاعات	
	دينار	فلس
طوايع مشك	١٩٩٧	١٠٠
مطالبة مفراة	١	٥٠
جزو ب مسيات الاستشاري	٢٧	٤٤٤
لمبرغ حاسك	٤٧٤	٠٤١

Handwritten notes at the bottom, including 'اسم وتوقيع المستلم' and 'اسم وخاتم أمين الصندوق'.



رقم الصرف: شهر  
المركز: شهر  
رقم التأدية: التاريخ

الدائرة: (رقماً وكتابة)  
الفصل:  
البرنامج:  
المشروع:  
رقماً وكتابة  
المادة:

الجمهورية الفلسطينية

### مستند صرف النفقات

(الاسم بين ثلاثة مقاطع والعنوان بالكامل)

مطلوب الى: مركز التسامح للتدريب

البيان	المبلغ بالعملة الأجنبية		العدد الكمية	العملة او البديل		المبلغ	
		سعر الصرف		دينار	فلس	دينار	فلس
تدبيرات منحة الطلبة الاول						121197	
على حساب الطلاب ٢٠٠٥							
المبايعات من اجلات المباديع							
بالتحصيل من مركز التدريب							
ساعة لتأجيله Bactuback							
حرد ساري							
						121197	93

اصلاح على صحة البيان المذكور اعلاه واشهد ان الاتفاق قد تم وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة

اسم المفوض بالاتفاق

توقيعه:

اسم المنظم وتوقيعه:

نقق فوجد مطابقاً للتشريعات المالية: مصنف ومحول أمين صندوق: مصرف

سجل تحت رقم:

التاريخ: التاريخ: ٢٠٠٥ / ١٨ / ٢٠٠٥

الاسم والتوقيع: الاسم والتوقيع:

وصلتي مبلغ: ديناراً ٢٠٠٥ / ١ / فلساً في

اسم وتوقيع المستلم:

اسم وخاتم أمين الصندوق:

رقم الشيك:

تاريخه:

نوع الاقطاع	الاقطاعات	
	دينار	فلس
طابع	1967	
ساعات	١	
مجموع	57	٢٤١
المجموع	٢٧٥	١٠٤١



رقم الصرف: ..... لشهر: .....  
 المركز: .....  
 رقم التأدية: ..... التاريخ: .....

الدائرة: .....  
 (رقماً وكتابة)  
 الفصل: .....  
 البرنامج: .....  
 المشروع: .....  
 (رقماً وكتابة)  
 المادة: .....

الجمهورية العربية الفلسطينية

**مستند صرف النفقات**

(الاسم من ثلاثة مقاطع والظوان بالكامل)

البيان	المبلغ بالعملية الأجنبية		العدد الكمية	المعبر او البديل		المبلغ	
	سعر الصرف			دينار	فلس	دينار	فلس
صحة البيان المذكور اعلاه وأشهد أن الاتفاق قد تم وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة اسم المفوض بالاتفاق						١٢٣١٩٧	٩٢٠
المجموع فقط						١٢٣١٩٧	٩٢٠

صحة البيان المذكور اعلاه وأشهد أن الاتفاق قد تم وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة

اسم المفوض بالاتفاق

توقيعه: .....

اسم المنظم وتوقيعه: .....

دقق فرج مطابقاً للتشريعات المالية. مصدق ومحول لأمين صندوق ..... مصرف .....

سجل تحت رقم: .....

التاريخ: ..... التاريخ: .....

الاسم والتوقيع: ..... الاسم والتوقيع: .....

وصلني مبلغ ..... ديناراً ..... فلساً في ٢٠ / ١ /

اسم وتوقيع المستلم: .....

اسم وخاتم أمين الصندوق: .....

نوع الاقتطاع	الاقتطاعات	
	دينار	فلس
	١٩٠٧	١٠٠
	٢٧	١٠٠٤١
المجموع	١٩٣٤	١٠٠٤١

*Handwritten notes and signatures in Arabic, including a large signature and some illegible text.*

## إقرار باستلام دفعة على الحساب

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه ..... محمد شمس .....

نقر نحن الموقعين إمضائنا وخاتمتنا في أدناه ..... بأننا قد

قبضنا من وزارة الأشغال العامة والإسكان مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار

أردني لا غير فقط ..... لا غير

رأى ذلك السيد مستخدم دينا ..... (١٤٣٢) من

وذلك قيمة الدفعة : ..... (أ) .....

عن مشروع : ..... البنية التحتية للمياه .....

عطاء رقم : ..... ٢٠٢٠/٨/٤٤ .....

وعليه توقع تحريرا : ٢٠٢٠/٨/٤٤ .

اسم المقاول : ..... شركة محمد شمس .....

توقيع المفوض بالتوقيع : ..... محمد شمس .....

الخاتم : .....

تم التوقيع بحضور :

الاسم : .....

الوظيفة : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....



محمد شمس



رئاسة الوزراء

مديرية المشتريات الحكومية

عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

وزارة المالية  
الديوان العام  
الوارد 8882  
التاريخ 2020/05/13 للوقت 12:15  
يحول إلى معالي وزير المالية



رقم ..... ١٠ / ١٣ / ١٠  
تاريخ ..... ١٩ / رمضان / ١٤٤١  
وافق ..... ٢٠٢٠/٠٥/١٢

معالي وزير الأشغال العامة والإسكان

أشير إلى كتابكم رقم ١٣٢٢٣٥/١/١٨/٤ تاريخ .....  
٢٠٢٠/٥/١٠

بناء على تنسيب معاليكم، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  
٢٠٢٠/٥/١٠ - بالاستناد لأحكام المادتين (٤٩/د، ٥٠/د) من نظام المشتريات الحكومية  
رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ - الموافقة من حيث المبدأ على ما يلي:-

١. مفاوضة وتلزييم المقاولين كل من (شركة حسان الكوز وأولاده، وشركة المشاريع  
المقحدة) للقيام بأعمال إنشاء وتجهيز ساحة المناولة التبادلية في مركز حدود العمري  
المبينة تفاصيلها في التقرير الفني المرفق بكتاب معاليكم المشار إليه أعلاه، بكلفة  
تقريبية تبلغ (٣,١٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار شاملة جميع الضرائب  
والرسوم، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال خلال مدة أقصاها شهر من  
التلزييم.

٢. تلزييم المكتب الهندسي الاستشاري العالمي أعمال الإشراف على تنفيذ الأعمال أعلاه  
بقيمة إجمالية لا تزيد على (٢٠٠,٠٠٠) عشرين ألف دينار شاملة جميع الضرائب  
والرسوم.

٣. استكمال الإجراءات اللازمة وفق النظام أعلاه أصولياً.

٤. تكليف معالي وزير المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية.

واقبلوا فائق الاحترام.

رئيس الوزراء

المدير العام والمختص  
٢٧/٥

نسخة/إلى معالي وزير المالية  
نسخة/إلى معالي وزير المالية/ المشتريات الحكومية  
نسخة/إلى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة  
نسخة/إلى عطوفة أمين سر مجلس الوزراء  
قرار رقم (٩٣٠٢)  
٥/١١/٢٠

BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER

(Section -2) Tender No. 17/2020

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )

المبالغ المستحقة ضمن المطالبة رقم (1)

No.	Item No.	Description	Unit	Unit Rate JD	Executed to Date		% Retention	Total Retention (JD)	Notes
					Quantity	Amount JD			
1	1.03.6(1) e	Lighting System for Steel Sheds Using High-Bay Units	L.S	9,346.60	1,000	9,346,600	10%	934,666	حجز نسبة 10% عن الأعمال الكهربائية لخدمات الفحص والتشغيل لحين كهرية المحول
2		OH & P of Item 1.03.6 (1) a	%		10%	934,660	10%	93,466	حجز لحين تسليم السياج للجهات المعنية وتزويدنا بمحضر التسليم حسب ما هو مطلوب في بند العطاء
3	2.02(1)	Demolishing & Removal of Existing curbstone and Side Walk	Sq.m	10.00	170.850	1,708,500	30%	512,55	حجز قيمة الكمية الممتدة لعينة ضبط الجودة المخالفة للمواصفات (الكمية 1000 متر مكعب)
4	3.02 (1)	Granular Sub-base Course ( 20 cm)	Cu.M	16.000	6,405,775	102,492,400	-	16000	حجز قيمة الكمية الممتدة لعينة ضبط الجودة المخالفة للمواصفات (الكمية 1000 متر مكعب)
5	3.03(1)	Aggregate Base Course ( 20 cm thick )	Cu.M	20.000	6,335,772	126,715,440	-	20000	حجز قيمة الكمية الممتدة لعينة ضبط الجودة المخالفة للمواصفات (الكمية 1000 متر مكعب)
6	4.05 (1)	Binder Course 8.0 cm	Sq.m	7.750	28,818,544	223,343,716	5%	11,167,186	حجز نسبة 5% عن الشبوات (عينات التفتيش + عينات ضبط الجودة)
7	4.05(2)	Wearing Course 6.0 cm	Sq.m	6.000	29,164,325	174,985,950	100%	174,985,950	حجز كامل قيمة أعمال الخلطات الإسفلتية السطحية لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة ووجود عيوب واضحة في الأعمال المنفذة ولحين تزويدنا بنتاج إعادة الفحص وإعادة تقييم الأعمال مرة أخرى.
8	5.01	Back to Back Ramp	L.m	3,500,000	50,000	175,000,000	5%	8,750,000	حجز نسبة 5% من قيمة الأعمال لحين استكمال ملاحظات المهندس الاشرافي وتسليم الأعمال
9	5.01	Street Shed 15x40	L.S	75,000,000	1,000	75,000,000	10%	7,500,000	حجز نسبة 10% من قيمة الأعمال لحين استكمال ملاحظات المهندس الاشرافي وتسليم الأعمال
10		BILL NO. 6 : Lighting, Traffic Signals and Electrical Installation				279,026,000	10%	27,902,600	حجز نسبة 10% عن الأعمال الكهربائية لخدمات الفحص والتشغيل لحين كهرية المحول
11		2.0 m High Fence	L.M	28,000	769,653	21,550,295	10%	2,155,030	حجز 10% لحين استلام أعمال السياج
								<b>270,001,441</b>	



# شركة المشاريع المتحدة – مقاولات عامة United Enterprises Company – General Contracting

Ref. : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_

الرقم : ٢٠٢٠/٣٤٨٩ م ر  
التاريخ : ٢٠٢٠/٠٧/٢٦

السادة / المكتب الهندسي الاستشاري العالمي المحترمين

المشروع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٧) الخاص بتنفيذ ساحات التبادل التجاري بمركز حدود  
العمرى – ساحة المناولة (Back To Back) – الجزء الثاني  
الموضوع: المطالبة المالية المرحلية رقم (١)

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم (١٥/م/٢٠٢٠/١٧) تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩ وكتابكم رقم (١٧/م/٢٠٢٠/١٧) تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤  
ولاحقا لكتابنا رقم (٢٠/م/٢٠٢٠/٣٤٧١) تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦، كتابنا رقم (٢٠/م/٢٠٢٠/٣٤٧٥) تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢ و كتابنا رقم  
(٢٠/م/٢٠٢٠/٣٤٨٥) تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩ بخصوص الموضوع أعلاه، نعيد اليكم تقديم المطالبة المالية المرحلية رقم (١)  
والخاصة بتنفيذ ساحات التبادل التجاري داخل مركز حدود العمرى، بعد أخذ ملاحظات المهندس المشرف بعين الاعتبار، والبالغ  
قيمتها (١٣٧٩٢٨٥,٧٥٠ دينار) فقط مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ديناراً وسبعمائة  
وخمسون فلس لا غير.

راجين منكم التكرم بتدقيق المطالبة طيه والايعاز لصاحب العمل بصرفها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المشاريع المتحدة



نسخة:

- وزارة الأشغال العامة والإسكان.
- الملف



**BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER**  
**(Section -2) Tender No. 17/2020**  
**INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )**

FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020

Page 1 of 9

The Employer	:	Ministry of Public Works and Housing
The Engineer	:	Associated Consulting Engineering ( ACE )
The Contractor	:	United Enterprises Co. ( UEC )
Contract Value	:	1,604,960.25 JD
Contract Start Date	:	May 20, 2020
Completion Date	:	

**1. Value of :**

No.	Description	Value JD	Notes
a)	Work Executed to date	1,451,879.74	1,418,508.13
b)	Variation Orders	0.00	
c)	Add Materials on Site	0.00	1,411,645.94
d)	Additional Works	0.00	
			1,411,645.94
<b>Gross Amount Due to Date ( a+b+c+d )</b>		<b>1,451,879.74</b>	<b>1,418,508.13</b>

**2. Deductions :**

No.	Description	Value JD	Notes
a)	5% Retention <i>5% x contract value</i>	72,593.99	80,248.01
b)	Previous Payment	0.00	
c)	Others	0.00	
d)	10% Advance Payment Recovery.	0.00	
e)	Deviations of the Test Results	0.00	
<b>Total Deductions (a+b+c+d+e)</b>		<b>72,593.99</b>	<b>80,248.01</b>

**3. Net Amount To Be Paid in This Interim Certificate**      1,379,285.75      JD      1,338,260.12

<b>Net Amount in Words :</b>	<b>One Million Three Hundred Seventy Nine Thousand Two Hundred Eighty Five Dollars and Seventy Five Cents</b>
------------------------------	---

<p><b>CONTRACTOR :</b>  <b>UNITED ENTERPRISES COMPANY</b>    <b>MANAGER</b>  <b>Eng. Jalal Qudus</b>  <b>info@uec-jo.com</b></p>	<p><b>Consultant</b>  <b>(The Engineer)</b>  <b>Associated Consulting Engineers</b>    <b>(Engineer's Representative)</b>    <b>Associated Consulting Engineers</b>  <b>Jordan</b></p>	<p><b>MPWH</b>  </p>
---	---	---



**BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER**  
**(Section -2) Tender No. 17/2020**

**INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )**  
**FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020**

**SUMMARY**

Page 2 of 9

Bill No.	Description	BOQ (JD)	Executed to Date (JD)	Previous Total (JD)	This Month Total (JD)
1	GENERAL PROVISIONS & PRELIMINARIE	16,500.000	12,833.260	0.000	12,833.260
2	EARTH WORKS	215,200.000	222,984.682	0.000	222,984.682
			192,724.941	185,758.24	
3	SUB-BASE & BASE COURSE	252,000.000	229,861.482	0.000	229,861.482
			229,207.81		
4	BITUMINOUS CONSTRUCTION	493,000.000	410,549.966	0.000	410,549.966
5	CONCRETE, STEEL & STRUCTURES	250,000.000	250,000.000	0.000	250,000.000
6	LIGHTING, TRAFFIC SIGNALS & ELECTRI	291,600.000	279,026.000	0.000	279,026.000
8	INCIDENTAL CONSTRUCTION	110,850.000	68,538.760	0.000	68,538.760
			65,572.394		
10	<b>Grand Total of Bills (Including all Provisional Sums and Prime Costs)</b>	<b>1,629,150.000</b>	<b>1,473,794.150</b>	<b>0.000</b>	<b>1,473,794.150</b>
			1,439,914.351	1432947,651	
11	Provisional Sums and Prime Costs & Percentage	16,500.000	12,833.260	0.000	12,833.260
12	Subtotal Excluding all Provisional Sums and Prime Costs (10)-(11)	1,612,650.000	1,460,960.890	0.000	1,460,960.890
			2,427,081.026	1420114,391	
13	Percent For Deduction (1.5%)	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
14	Value for Deduction (12) x (13)	24,189.750	21,914.413	0.000	21,914.413
			21,406.216	21301,71	
15	Total (1) : (12) - (14)	1,588,460.250	1,439,046.477	0.000	1,439,046.477
			1,418,508.135	1,405,674.875	1398812,67
	<b>Total of Contract: (11) + (15)</b>	<b>1,604,960.250</b>	<b>1,451,879.737</b>	<b>0.000</b>	<b>1,451,879.737</b>
			1411645,914		

**CONTRACOR :**  
**UNITED ENTERPRISE COMPANY**



**Consultant**  
**(The Engineer)**  
**Associated Consulting Engineers**

**(Engineer's Representative)**

المكتب الهندسي  
المهندسين الاستشاريين  
Associated Consulting Engineers  
Int'l.

**MPWH**



**CONTRACTOR**  
United Enterprises co.  
( UEC )

**BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER**  
(Section -2) Tender No. 17/2020  
**INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )**  
FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020

**CONSULTANT**  
Associated Consulting  
Engineering  
( ACE )



**BILL NO. 1 : GENERAL PROVISIONS & PRELIMINARIES**

Item No.	Description	Unit	Unit Rate JD	Contract B.O.Q		Executed to Date		Previous Works		This Month	
				Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount US\$
1.03.6	<u>Existing Utilities</u>										
1.03.6(1)	Provisional Sums for any additional works	P.S	15,000.00	1.000	15,000.000						
1.03.6(2)	OH & P of Item 1.03.6 (1)	10%	1,500.00		1,500.000						
1.03.6(1) a	Lighting System for Steel Sheds Using High-Bay Units	L.S	9,346.60	1.000	-	1.000	9,346.600	0.000	0.000	1.000	9,346.600
1.03.6(2)	OH & P of Item 1.03.6 (1) a	%	10.00	10.000	-	10%	934.660	0.000	0.000	0.100	934.660
1.06 (2)	Rental of Accommodation	Month	700.000	1.500	-	1.000	700.000	0.000	0.000	1.000	700.000
1.03.6(2)	OH & P of Item 1.03.6 (1)	%	10.00	10%	-	10%	70.000	0.000	0.000	0.100	70.000
1.10	Rental of Pick-up	Month	1,350.000	1.500	-	1.200	1,620.000	0.000	0.000	1.200	1,620.000
1.03.6(2)	OH & P of Item 1.03.6 (1)	%	10.00	10%	-	10%	162.000	0.000	0.000	0.100	162.000
<b>TOTAL For Bill No.1 (JD)</b>					<b>16,500.000</b>		<b>12,833.260</b>		<b>0.000</b>		<b>12,833.260</b>

بند بصره  
بند بصره  
بند بصره  
بند بصره

بند بصره (10%) عند البند 1.03.6  
تفانيات (بصره و تصفيه)

The Contractor  
www.uec-jordan.com

The Engineers Representative

**CONTRACTOR**  
United Enterprises co.  
( UBC )



**BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER**  
(Section -2) Tender No. 17/2020  
**INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )**  
FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020

**CONSULTANT**  
Associated Consulting  
Engineering  
( ACE )



**BILL NO. 2 : EARTH WORKS**

Page 4 of 9

Item No.	Description	Unit	Unit Rate JD	Contract B.O.Q		Executed to Date		Previous Works		This Month	
				Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount US\$
2.01	Clearing & Grubbing	Cu.M	4.00	1,000.000	4,000.000	1,741.675	6,966.700	0.000	0.000	1,741.675	6,966.700
2.02(1)	Demolishing & Removal of Existing curbstone and Side Walk	Sq.m	10.00	300.000	3,000.000	170.850	1,708.500	0.000	0.000	170.850	1,708.500
2.02(2)	Dismantling of Existing Fence	L.M	10.00	300.000	3,000.000	291.335	2,913.350	0.000	0.000	291.335	2,913.350
2.03	<b>HIGHWAY EXCAVATION</b>										
2.03(1)	Unclassified highway excavation	Cu.M	4.000	5,000.000	20,000.000	863.568	3,454.271	0.000	0.000	863.568	3,454.271
2.06	<b>EMBANKMENT CONSTRUCTION</b>										
2.06(1)	Embankment construction	Cu.M	5.000	20,000.000	100,000.000	24,234.633	121,173.166	0.000	0.000	20,000	100,000
2.07	<b>SUBGRADE CONSTRUCTION AND TOPPING</b>										
2.07(1)	Sub-Grade Layer Topping	Cu.M	12.000	7,100.000	85,200.000	7,230.725	86,768.695	0.000	0.000	7,230.725	86,768.695
				TOTAL For Bill No.2 (JD)		215,200.000		222,984.682		222,984.682	

المساحة فقط  
تسوية لعمارة المنطقة

تسوية لعمارة المنطقة  
المساحة فقط


تسوية لعمارة المنطقة  
المساحة فقط

185758,24

192724.941

77,682.10

موزونة نسبة (البنوك) طين سليم السطح للمهاينة / (البنوك) 2022  
وتدويرها على جدران السليم حسب ما هو مطلوب في رول 11.0.0.2



The Engineers Representative

CONTRACTOR  
United Enterprises co.  
( UEC )



BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER  
(Section -2) Tender No. 17/2020  
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )  
FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020

CONSULTANT  
Associated Consulting  
Engineering  
( ACE )



BILL NO. 3 : SUB-BASE & BASE COURSE

Page 5 of 9


Item No.	Description	Unit	Unit Rate JD	Contract B.O.Q		Executed to Date		Previous Works		This Month	
				Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount US\$
3.02	GRANULAR SUB- BASE COURSE										
3.02 (1)	Granular Sub-base Course ( 20 cm)	Cu.M	16.000	7,000.000	112,000.000	6,418.779	102,700.461	0.000	0.000	6,418.779	102,700.461
3.03	AGGREGATE BASE COURSE										
3.03(1)	Aggregate Base Course ( 20 cm thick )	Cu.M	20.000	7,000.000	140,000.000	6,358.051	127,161.021	0.000	0.000	6,358.051	127,161.021
TOTAL For Bill No.3 (JD)					252,000.000		229,861.482	0.000	0.000		229,861.482

102,492.4  
126,715.44  
~~102,492.4~~

229,207.840

جزر كالمستحق لأعمال الختملة لمبنا كمنب وجوده قائمة للواحد  
لطبقي ل  
Base & S. Base

The Engineers Representative



CONTRACTOR

United Enterprises co.

(UEC)



BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER

(Section -2) Tender No. 17/2020

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )

FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020

CONSULTANT

Associated Consulting

Engineering


(ACE)



BILL NO. 4 : BITUMINOUS CONSTRUCTION

Item No.	Description	Unit	Unit Rate JD	Contract B.D.Q		Executed to Date		Previous Works		This Month	
				Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount US\$
4.02	BITUMINOUS PRIME AND TACK COATS										
4.02.(1)	Bituminous Prime Coat MC-70,	Ton	450.000	40.000	18,000.000	23.954	10,779.300	0.000	0.000	23.954	10,779.300
4.02.(2)	Bituminous Tack Coat (RC-250)	Ton	500.000	15.000	7,500.000	2.882	1,441.000	0.000	0.000	2.882	1,441.000
4.05	Bituminous Binder & Wearing Courses										
4.05 (1)	Binder Course 8.0 cm	Sq.m	7.750	34,000.000	263,500.000	28,818.544	223,343.716	0.000	0.000	28,818.544	223,343.716
4.05(2)	Wearing Course 6.0 cm	Sq.m	6.000	34,000.000	204,000.000	29,164.325	174,985.950	0.000	0.000	29,164.325	174,985.950
				TOTAL For Bill No.4 (JD)							
				493,000.000		410,549.966		0.000		410,549.966	

مجزز زينة عن الشوران  
 (تصميم + صبليكون)  
 مجز كامل صفة  
 اعمال الخلية  
 الاسفلتية  
 السطوح



The Engineers Representative

CONTRACTOR

United Enterprises co.

(UEC)



BACK TO BACK YARD AT OMIYAR BORDER

(Section -2) Tender No. 17/2020

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )

FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020

CONSULTANT

Associated Consulting


Engineering

(ACE)



BILL NO. 5 : CONCRETE, STEEL AND STRUCTURES

Item No.	Description	Unit	Unit Rate JD	Contract B.O.Q		Executed to Date		Previous Works		This Month	
				Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount US\$
5	CONCRETE AND CONCRETE MIXES										
5.01	Back to Back Ramp	L.m	3,500.000	50.000	175,000.000	50.000	175,000.000	0.000	0.000	50.000	175,000.000
5.01	Steel Shed 15x40	L.S	75,000.000	1.000	75,000.000	1.000	75,000.000	0.000	0.000	1.000	75,000.000
<b>TOTAL For Bill No.5 (JD)</b>					<b>250,000.000</b>		<b>250,000.000</b>		<b>0.000</b>		<b>250,000.000</b>



جواز ترقية عن أعمال بطانات طين استكمال المرافق المزمعة  
من الهندسة / انث بي والحارة انما تكملة من ذلك .

The Engineers Representative

CONTRACTOR

United Enterprises co.

(UEC)



BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER

(Section -2) Tender No. 17/2020

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )

FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020

CONSULTANT

Associated Consulting


Engineering

(ACE)



**BILL NO. 6 : Lighting, Traffic Signals and Electrical Installation**

Item No.	Description	Unit	Unit Rate JD	Contract B.O.Q		Executed to Date		Previous Works		This Month	
				Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount US\$
6.04	High Mast Assembly	No.	20,300.000	10.000	203,000.000	10.000	203,000.000	0.000	0.000	10.000	203,000.000
6.04 (1)	30 m High Mast with 9x 500 w flood lights	No.	4,000.000	1.000	4,000.000	1.000	4,000.000	0.000	0.000	1.000	4,000.000
6.11	MDB & Feeder Pillar	No.	4,000.000	1.000	4,000.000	1.000	4,000.000	0.000	0.000	1.000	4,000.000
6.11 (1)	MDB	No.	4,000.000	1.000	4,000.000	1.000	4,000.000	0.000	0.000	1.000	4,000.000
6.11 (2)	Feeder Pillars	No.	2,500.000	1.000	2,500.000	1.000	2,500.000	0.000	0.000	1.000	2,500.000
6.11 (3)	FP 1	No.	2,500.000	1.000	2,500.000	1.000	2,500.000	0.000	0.000	1.000	2,500.000
6.12 (1)	Cable and Accessories	L.M	150.000	50.000	7,500.000	20.000	3,000.000	0.000	0.000	20.000	3,000.000
6.12 (1.a)	Supply of CU Cables	L.M	32.000	800.000	25,600.000	767.000	24,544.000	0.000	0.000	767.000	24,544.000
6.12 (1.b)	4x300 mm2	L.M	29.000	1,500.000	43,500.000	1,258.000	36,482.000	0.000	0.000	1,258.000	36,482.000
6.12 (1.b)	4x35 mm2	No.	500.000	3.000	1,500.000	3.000	1,500.000	0.000	0.000	3.000	1,500.000
6.12 (1.b)	4x25 mm2										
6.12 (2)	Isolator										
<b>TOTAL For Bill No.6 (JD)</b>				<b>291,600.000</b>	<b>279,026.000</b>	<b>279,026.000</b>	<b>0.000</b>	<b>279,026.000</b>	<b>0.000</b>	<b>279,026.000</b>	<b>279,026.000</b>



مخبر نسبة (10%) عند كامة العمل للمراجعة  
لفائدة المهندس الاستشاري

The Engineers Representative

CONTRACTOR

United Enterprises co.

(UEC)



BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER

(Section -2) Tender No. 17/2020

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 1 )

FOR THE PERIOD ENDING 30/06/2020

CONSULTANT  
Associated Consulting  
Engineering  
(ACE)



**BILL NO. 8 : INCIDENTAL CONSTRUCTION**


Page 9 of 9

Item No.	Description	Unit	Unit Rate JD	Contract B.O.Q.		Executed to Date		Previous Works		This Month	
				Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount JD	Quantity	Amount US\$
8.01	CONCRETE CURBS, GUTTERS, SIDE WALLS AND PAVED MEDIANS										
8.01 (1)	Precast Concrete Curbs Class (25)	L.M	16.000	1,000.000	16,000.000	927.260	14,836.160	0.000	0.000	927.260	14,836.160
8.01 (2)	Pre-Cast Concrete Tiling for Side Walk	SQ.M	16.000	1,000.000	16,000.000	1,545.061	24,720.976	0.000	0.000	1,350.66	21,754.56
8.01 (3)	Side Walk Edge Beam	L.M	16.000	1,000.000	16,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8.05 (1)	Concret Lining for Ditches and Slope Protection	SQ.M	28.000	1,200.000	33,600.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8.10 (3)	Temporary Plastic Barrier (2.0 m)	L.M	75.000	50.000	3,750.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8.11	Highway Signing										
8.11 (1)	Less than 1.0 SQM	No.	ملفي	-	-	-	-	-	-	-	-
8.11 (2)	Exceeding 1.0 SQM	SQ.M	ملفي	-	-	-	-	-	-	-	-
8.12	Pavement Marking										
8.12 (1)	TRP	SQM	15.000	200.000	3,000.000	417.722	6,265.829	0.000	0.000	417.722	6,265.829
8.12 (2)	TRP	SQM	30.000	50.000	1,500.000	38.850	1,165.500	0.000	0.000	38.850	1,165.500
8.12 (3)	Direction Arrow	No.	ملفي	-	-	-	-	-	-	-	-
8.12 (4)	Cat Eyes 15 x 15 cm	No.	ملفي	-	-	-	-	-	-	-	-
8.14 (1)	2.0 m High Fence	L.M	28.000	750.000	21,000.000	769.653	21,550.295	0.000	0.000	769.653	21,550.295
8.16 (2)	Pre-Cast Concrete Barrier	L.M	ملفي	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL For Bill No.8 (JD)</b>					<b>110,850.000</b>		<b>68,538.760</b>		<b>0.000</b>		<b>68,538.760</b>

10% حجز  
فينا اكمال  
اعمال ايج

65,572.344

The Engineers Representative









# شركة المشاريع المتحدة وشركة الآليات العامة



سند صرف فرعي

دينار

فلس

No 04518

التاريخ : ٢٠١٠ / ٠١ / ٠١

المذموم له

ووصلني من شركة المشاريع المتحدة وشركة الآليات العامة

مبلغ وقدره

وذلك

المصادقة

مأمور الصرف

المستلم

**Summary Sheet**

Ministry of Public Works and Housing Project Name Back to Back Yard at Omary Border ( Section 2 ) Project No. 17/2020		Payment No. 1  <b>GENERAL PROVISIONS</b>	Engineer Contractor Associated Consulting ACE United Enterprises Co.
--	--	--	--

**RENTAL OF PICK-UP**

Item No. 1.06(2)

NO.	MONTH		PERCENTAGE	QUANTITY	NOTES
	FROM	TO	%	MONTH	
1	21/5/2020	31/5/2020	33.333%	0.333	
2	1/6/2020	27/6/2020	86.667%	0.867	
<b>TOTAL CARRIED TO B.O.Q</b>				<b>1.200</b>	

Contractor 

  
 Page 1/1

  
 Consultant



Project :		Surveyor :			
Item :		Chain-men :			
Date : 19-5-2020		Instrument : leveling Groubling			
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I. R. Level
0+300	€				525.24
	R 10				525.28
	R 20				525.26
	R 30				525.14
	R 40				525.08
	R 50				525.12
	R 60				526.00
	L 10				525.21
	L 20				525.23
	L 30				525.25
	L 40				525.31
	L 50				525.36
	L 60				525.58

Remarks

(0+28 — 0+560)

ملاحه الاشارة  
 [Signature]  
 [Signature] 01/05/2020

Project :		Surveyor :		Remarks			
Item :		Chain-men :					
Date :		Instrument :					
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I.	R. Level	
0+320	6E					525.28	
	R 10					525.36	
	R 20					525.20	
	R 30					525.08	
	R 40					525.03	
	R 50					525.04	
	R 60					526.08	
	L 10					525.31	
	L 20					525.36	
	L 30					525.28	
	L 40					525.33	
	L 50					525.38	
	L 60					525.35	
						525.50	

25/8/88

*[Signature]*

Remarks

Project:		Surveyor :				
Item :		Chain- men:				
Date :		Instrument:				
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I.	R. Level
0+340	E					525.44
	R 10					525.33
	R 20					525.25
	R 30					524.98
	R 40					524.92
	R 50					525.12
	R 60					526.28
	L 10					525.48
	L 20					525.47
	L 30					525.49
	L 40					525.46
	L 50					525.44
	L 60					525.51

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Remarks

Project:	Surveyor :			Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I.	R. Level
	Item:	Chain- men:	Instrument:							
Date :				0+360	4					525.28
				R 10						525.33
				R 20						525.29
				R 30						525.17
				R 40						524.93
				R 50						525.22
				R 60						526.41
				L 10						525.51
				L 20						525.53
				L 30						525.55
				L 40						525.56
				L 50						525.57
				L 60						525.62

*[Handwritten signature]*

Project :		Surveyor :			Remarks		
Item :		Chain-men :					
Date :		Instrument :					
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.			
0+380	4					525.08	
	R 10					525.43	
	R 20					525.54	
	R 30					525.15	
	R 40					525.00	
	R 50					525.20	
	R 60					526.66	
	L 10					525.48	
	L 20					525.61	
	L 30					525.68	
	L 40					525.60	
	L 50					525.56	
	L 60					525.55	


Project :

Surveyor :

Item :

Chain-men :

Date :

Instrument :

Remarks

Station No.

Dist

B.S.

Inter

I.S.

H.I.

R. Level

0+400

C

R 10

R 20

R 30

R 40

R 50

R 60

L 10

L 20

L 30

L 40

L 50

L 60

525.06

525.03

525.28

525.34

525.15

525.31

526.71

525.46

525.55

525.58

525.51

525.46

525.40

*[Handwritten signature]*

Project :		Surveyor :			Remarks		
Item :		Chain-men :					
Date :		Instrument :					
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.			
0+420	±					523.40	
	R 10					523.01	
	R 20					524.38	
	R 30					524.55	
	R 40					525.02	
	R 50					525.48	
	R 60					526.90	
	L 10					523.84	
	L 20					525.10	
	L 30					525.31	
	L 40					525.28	
	L 50					525.36	
	L 60					525.36	


Project :		Surveyor :		Remarks			
Item :		Chain-men :					
Date :		Instrument :					
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I.	R. Level	
0+440	Ce					525.21	
	B 10					525.20	
	B 20					525.21	
	B 30					525.22	
	B 40					525.28	
	B 50					525.46	
	B 60					526.70	
	L 10					525.21	
	L 20					525.30	
	L 30					525.40	
	L 40					525.43	
	L 50					525.40	
	L 60					526.39	


Project :

Item :

Date :

Surveyor :

Chain-men :

Instrument :

Remarks

Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I.	R. Level
0+460	4					525.22
	R 10					525.08
	R 20					525.18
	R 30					525.21
	R 40					525.26
	R 50					525.38
	R 60					526.92
	L 10					525.26
	L 20					525.34
	L 30					525.41
	L 40					525.49
	L 50					525.44
	L 60					525.40



Project :		Surveyor :				Remarks
Item :		Chain-men:		H.I.	R. Level	
Date :		Instrument:				
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.		
0. + 480	☒				524.31	
	R 10				523.85	
	R 20				524.00	
	R 30				524.71	
	R 40				525.20	
	R 50				525.65	
	R 60				526.90	
	L 10				525.26	
	L 20				525.74	
	L 30				525.42	
	L 40				525.51	
	L 50				525.48	
	L 60				525.46	


Project:

Item:

Date:

Surveyor:

Chain-men:

Instrument:

Remarks

Station No.

Dist

B.S.

Inter

F.S.

H.I.

R. Level

0+500

±

R 10

R 20

R 30

R 40

R 50

R 60

L 10

L 20

L 30

L 40

L 50

L 60

525.000

525.18

525.28

525.30

525.33

525.55

527.01

525.30

525.35

525.31

525.46

525.45

525.43

Handwritten signature and initials.

Project:		Surveyor:					Remarks
Item:		Chain-men:					
Date:		Instrument:					
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I.	R. Level	
0+520	±					525.17	
	R 10					525.41	
	R 20					525.44	
	R 30					525.43	
	R 40					525.46	
	R 50					525.50	
	R 60					524.03	
	L 10					525.00	
	L 20					524.03	
	L 30					524.06	
	L 40					525.26	
	L 50					525.51	
	L 60					525.49	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten checkmark]*

Project :		Surveyor :				Remarks
Item :		Chain-men :				
Date :		Instrument :				
Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I.	R. Level
0+540	CF					524.90
	R 10					525.56
	R 20					525.20
	R 30					525.30
	R 40					525.25
	R 50					525.26
	R 60					527.10
	L 10					524.84
	L 20					528.95
	L 30					523.15
	L 40					523.50
	L 50					524.00
	L 60					524.60


**Remarks**

Project :		Surveyor :		Chain-men :		Instrument :	
Item :		inter		E.S.		H.I.	
Date :		B.S.		F.S.		R. Level	
Station No.	Dist						
0+560	☺					525.01	
	R 10					524.97	
	R 20					525.12	
	R 30					525.04	
	R 40					524.84	
	R 50					524.94	
	N 60					527.12	
	L 10					525.6	
	L 20					525.40	
	L 30					522.93	
	L 40					523.15	
	L 50					523.78	
	L 60					525.30	

*[Handwritten signatures]*


Remarks

Station No.	Dist	B.S.	Inter	F.S.	H.I.	R. Level	Surveyor :		
							Chain-men:	Instrument:	Remarks
0+570	6					525.20			
	R 10					525.05			
	R 20					525.01			
	R 30					524.88			
	R 40					524.62			
	R 50					525.01			
	R 60					527.09			
	L 10					525.11			
	L 20					525.29			
	L 30					525.45			
	L 40					524.00			
	L 50					524.40			
	L 60					520.07			

مركز ولاية الامير

self

2006/11/20







**Claculation Sheet**

Ministry of Public Works and Housing  
 Project Nam: Back to Back yard at  
 Omary Border  
 ( Section 2 )  
 Project No. 17/2020

PAYMENT NO. ( 1 )

Cut & Fill

Engineer Associated Consulting  
 Engineers (ACE)  
 Contractor & United Enterprises  
 Company ( UEC )

Cut & Fill For Back to Back Yard

Item No. 2.03.3(1) - 2.06.5(1)

Station	Area		Average Area		Dist.	Volume		Cumulative Volume		Note
	Sq.m		Sq.m			Cu.m		Cu.m		
	Fill	Cut	Fill	Cut		Fill	Cut	Fill	Cut	
0+288.32	21.424	8.188								
			26.366	7.381	11.68	307.870	86.188	307.870	86.188	
0+300	31.307	6.574								
			34.917	5.241	20	698.340	104.820	1,006.210	191.008	
0+320	38.527	3.908								
			39.013	5.001	20	780.250	100.010	1,786.460	291.018	
0+340	39.498	6.093								
			41.620	6.538	20	832.390	130.760	2,618.850	421.778	
0+360	43.741	6.983								
			45.552	6.678	20	911.030	133.560	3,529.880	555.338	
0+380	47.362	6.373								
			56.187	3.503	20	1123.730	70.060	4,653.610	625.398	
0+400	65.011	0.633								
			109.969	0.628	20	2199.370	12.550	6,852.980	637.948	
0+420	154.926	0.622								
			118.716	0.552	20	2374.310	11.040	9,227.290	648.988	
0+440	82.505	0.482								
			86.582	0.494	20	1731.640	9.870	10,958.930	658.858	
0+460	90.659	0.505								
			110.524	0.587	20	2210.470	11.730	13,169.400	670.588	
0+480	130.388	0.668								
			106.052	0.804	20	2121.030	16.080	15,290.430	686.668	
0+500	81.715	0.940								
			88.537	1.145	20	1770.740	22.900	17,061.170	709.568	
0+520	95.359	1.350								
			122.699	1.534	20	2453.970	30.680	19,515.140	740.248	
0+540	150.038	1.718								
			152.295	1.741	3.69	561.967	6.424	20,077.107	746.672	
0+543.69	154.551	1.764								
			152.413	0.882	16.31	2485.848	14.385	22,562.955	761.058	
0+560	150.274	0.000								
			98.389	0.000	9.21	906.060	0.000	23,469.014	761.058	
0+569.21	46.503	0.000								
			69.139	0.000	0.79	54.689	0.000	23,523.703	761.058	
0+570	91.775	0.000								
			71.093	0.000	10.00	710.930	0.000	24,234.633	761.058	
0+580	50.411	0.000								
Cut For Connection With Existing Road										
170.850 X 0.60							102.510			
								20,100		
Total of this page								24,234.633	863.568	
Total Carried Summary								24,234.633	863.568	

Contractor

Consultant

نقمنا لربقة البر حبل نقمنا كنه لطاى (20,000) كنه كحل لكلك البر حبل واقاردها كنه ب كملان ساد كلى كرم نقمنا .  
 نقمنا نقمنا نقمنا البر حبل

Calculation Sheet

Ministry of Public Works and Housing  
 Project Name : Back to Back yard at  
 Omary Border  
 ( Section 2 )  
 Project No. 17/2020

Payment No. 1  
 BILL NO.2

Engineer : Associated Consulting  
 Contractor : United Enterprises Co.

**BILL NO.2: EARTH WORKS**

Sub-Grade Layer Topping ( 200 mm thick ) / Cu.m

Item No.2.07.4(1)

STATION	AREA TOPPING	DISTANCE	VOLUME TOPPING	REMARK
0+288.320	<del>13.966</del>			
0+300.000	<del>23.976</del>	11.680	<del>279.981</del>	269.57
0+320.000	<del>23.976</del>	20.000	<del>479.520</del>	
0+340.000	<del>23.976</del>	20.000	<del>479.520</del>	
0+360.000	<del>25.199</del>	20.000	<del>491.790</del>	
0+380.000	<del>25.593</del>	20.000	<del>507.920</del>	
0+400.000	<del>24.021</del>	20.000	<del>496.140</del>	
0+420.000	<del>24.184</del>	20.000	<del>482.050</del>	
0+440.000	<del>24.228</del>	20.000	<del>484.120</del>	
0+460.000	<del>25.891</del>	20.000	<del>501.190</del>	
0+480.000	<del>25.820</del>	20.000	<del>517.110</del>	
0+500.000	<del>25.894</del>	20.000	<del>517.140</del>	
0+520.000	<del>26.008</del>	20.000	<del>519.020</del>	
0+540.000	<del>27.076</del>	20.000	<del>530.840</del>	
0+543.690	<del>17.069</del>	3.690	<del>99.898</del>	85.13
0+560.000	<del>28.348</del> 20.846	16.310	<del>451.926</del>	358.3
0+569.209	13.096	9.209	190.829	156.38
0+570.000	13.096	0.791	10.359	<del>70.188</del>
0+580.000	13.096	10.000	130.960	
DEDUCT		RAMP BACK TO BACK	-120.000	600 X 0.20
		FORKLIFT RAMP	-9.250	46.250 X 0.20
CONNECTION WITH EXISTING ROAD ( 273.804 X 0.20)			54.761	
Topping Under Concrete for Side Walk	878.03	0.15	<del>131.705</del>	AT ENTRANCE & MEDIAN & EXIT
	0.008	404.590	<del>3.237</del>	
Total Carried Summary			7,230.725	

6473.51

Contractor  


Consultant  


Claculation Sheet

Ministry of Public Works and Housing  
 Project Name : Back to Back yard at  
 Omary Border  
 ( Section 2 )  
 Project No. 17/2020

Payment No. 1

Engineer : Associated Consulting

BILL NO.3

Contractor : United Enterprises Co.

**BILL NO.3 : SUB-BASE & BASE COURSE**

**GRANULAR SUB BASE COURSE 20cm**

Item No.3.03(1)

STATION	AREA SUB-BASE	DISTANCE	VOLUME TOPPING	REMARK
0+288.320	<del>22.856</del>			
0+300.000	<del>22.856</del>	11.680	<del>266.958</del>	266.78
0+320.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+340.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+360.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+380.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+400.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+420.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	2
0+440.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	28.82
0+460.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	456.82
0+480.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+500.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+520.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+540.000	<del>22.856</del>	20.000	<del>457.120</del>	
0+543.690	<del>22.856</del>	3.690	<del>84.339</del>	84.28
0+560.000	20.625 ✓	16.310	354.588	354.47
0+569.209	12.856 ✓	9.209	154.163	
0+570.000	12.856 ✓	0.791	10.169	
0+580.000	12.856 ✓	10.000	128.560	
CONNECTION TO EXISTING ROAD ( 318.061 X 0.20 )			<del>63.812</del>	51.761
		273.804		
DEDUCT	RAMP BACK TO BACK		-120.000	600 X 0.20
	FORKLIFT RAMP		-9.250	46.250 X 0.20
Total Carried Summary			<del>6,418.779</del>	

6405.775

Contractor  


Consultant  


Claculation Sheet

Ministry of Public Works and Housing  
 Project Name : Back to Back yard at  
 Omary Border  
 ( Section 2 )  
 Project No. 17/2020

Payment No. 1  
 BILL NO.3

Engineer : Associated Consulting  
 Contractor : United Enterprises Co.

**BILL NO.3 : SUB-BASE & BASE COURSE**

**AGGREGATE BASE COURSE 20cm**

Item No.3.03(1)

STATION	AREA BASE COARSE	DISTANCE	VOLUME TOPPING	REMARK
0+288.320	<del>22.616</del>			
0+300.000	<del>22.616</del>	11.680	<del>264.155</del>	263.98
0+320.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+340.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+360.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+361.746	<del>22.616</del>	1.746	<del>39.488</del>	
0+380.000	<del>22.616</del>	18.254	<del>412.832</del>	20
0+400.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	20.252
0+420.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	45.252
0+440.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+460.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+480.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+500.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+520.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+540.000	<del>22.616</del>	20.000	<del>452.320</del>	
0+543.690	<del>22.616</del>	3.690	<del>83.453</del>	83.398
0+560.000	20.385	16.310	<del>350.673</del>	350.551
0+569.209	12.616	9.209	151.953	
0+570.000	12.616	0.791	9.979	
0+580.000	12.616	10.000	126.160	
CONNECTION TO EXISTING ROAD ( 365.438 X 0.20 )			73.988	
			273.804	59.761
DEDUCT	RAMP BACK TO BACK		-120.000	600 X 0.20
	FORKLIFT RAMP		-9.250	46.250 X 0.20
Total Carried Summary			6,358.051	

6,335.772

Contractor  


Consultant  


Calculation Sheet

Ministry of Public Works and Housing Project Name : Back to Back yard at Omary Border ( Section 2 ) Project No. 17/2020	Payment No. 1  BILL NO.4	Engineer : Associated Consulting  Contractor : United Enterprises Co.
<b>BILL NO.4 : BITUMINOUS CONSTRUCTION</b>		
MC-70	Item No.4.02(1)	

	STATION		DISTANCE	Area	RATE	QUANTITY / TON	REMARK
	From	To					
①	0+288.320 <del>0+300</del> 0+560	0+400	111.68	20,950.468	0.790	16.551	Lt55 - Rt55 Rt30 - Lt55 Lt30 - Lt55
②	0+400 0+310	0+500 0+325	100.00 15.00	2632.686	0.880	2.317	Rt30 - Rt55 الهنجر
③	0+500	0+570	70.00	5086.812	1.000	5.087	Lt30 - Rt55
①	0+288.320 L55 - R55 8	0+400		Total Area = 20,950.468			
	0+400 - 0+310 L55 - R30 8						
	0+310 - 0+560 (L55 - L30)						
Total ( TON )						23.954	

Contractor  


  
Consultant





شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
( دائرة الحركة والتحميل )  
إجازة مرور و سند تحميل

رقم الحمولة : 12215875 التاريخ : 06/06/2020  
المادة : أسفلت سائب أم سي 70  
الوزن القائم : 20770 كغم  
الوزن الفارغ : 10300 كغم  
الوزن الصافي : 10470 كغم  
الكثافة في الهواء على 15م : 966.9256  
رقم الخزان : 193  
رقم الشهادة : 208  
رقم الصوريج : 6034892  
أرقام الأختام : 1841839

2

الكثافة في الفراغ على 15م : 968.0000

نوع الحمولة : حمولة سائبة بسيارات العميل  
عدد البراميل :

اسم الناقل : العميل نفسه / شركة ووثة عبد الرحمن اسعد السقا

رقم الطلب	رقم الفسطة	رقم قسيل	اسم القسيل	الكمية المطلوبة	وحدة القياس
7493	6826373	2336232	قتلاب البيطري والمشاريع والاي	11000	كيلوجرامات

كاتب النموذج : محمد يوسف احمد شلش  
مساعد المكتب : معزود سلمان محمد محمد

عامل/مراقب التحميل : مالك احمد محمد بني سعيد  
رقم هاتف : 99000215 / 9491011238

عامل التهيئة : عواد حمدان عواد عليماث  
عامل المراقبة التفقيش : عادل عبد الله خلف مشاقبه

مأمور القبان الفارغ : احمد محمد مفلح دويكات  
مراقب بوابة الدخول : عصام صدقي عبدالرحيم ابوترايه

مأمور القبان القائم : عدنان احمد محمد عكور


نسخة الناقل  
08:06:51 06/06/2020

Handwritten signature and stamp

Engineer



المكتب الهندسي الاستشاري



Contractor



شركة المشاريع المتحدة

تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز طود العمري

(ساحة المنــــاولة Back to Back)

CENTRAL TENDER NO. 17/2020

Rate of Application // (Prime Coat) Tack Coat, CSS-1) ASTM D-2027, ASTM D- 977						
						Date: 6/6/2020
						IR NO: 44 and 46
Location	: <u>Rand L.H.S.P From Yarde</u>					
Station	: <u>From sta. 0+288 to sta. 0+400</u>					
Material	: <u>Me-70</u>					
Sample No.		1	2	3	4	5
Location	0+302	0+302	0+330	0+358	0+386	
Plates No.		A	B	C	D	
Weight of Plate, kg	A	0.470	0.438	0.514	0.404	
Weight of Bitumen and Plate, kg	B	0.600	0.520	0.632	0.536	
Weight of Bitumen, kg	C = B - A	0.13	0.084	0.118	0.132	
Area of Plate, cm <sup>2</sup>	D	0.148	0.148	0.148	0.148	
Rate of Bitumen, kg / cm <sup>2</sup>	E = C / D	0.88	0.57	0.80	0.89	
Average Rate of Application, kg/cm <sup>2</sup>	F	0.79				
Remarks:	<u>Sample passed. From (0.75 to 2.0)</u>					
Contractor			CONSULTANT			
<u>Yousef ALizibdeh</u>			<u>محمد وليد</u>			

<b>Project No. : 1712020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المنى - أولاً - الجزء الثاني)	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> 45
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 6/6/2020

**REQUEST FOR INSPECTION**

We request your attendance to inspect the following works :

1. TYPE :  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. INSPECTION TIME : \_\_\_\_\_ DATE : 1 / 1

3. LOCATION : Zone \_\_\_\_\_ Road 0+288 → 0+400 Stations/Nodes \_\_\_\_\_ Drawing No. Rt

4. INSPECTION :  First  Second  Third

5. PURPOSE OF THE INSPECTION :


<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat <input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting-out <input type="checkbox"/> Civil Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
---	---	---	--

Others (specify) please check spraying prime coat (MC 70)

Particular Details \_\_\_\_\_

Submitted by : Eng. Malik Signature \_\_\_\_\_

6. INSPECTION REPORT :

<input type="checkbox"/> Surveyor		0+288 → 0+400 (155-C) مخطط الموقع مخطط خطة العمل MC	<b>SIGNATURE:</b> 
<input checked="" type="checkbox"/> Mak. Eng.			
<input type="checkbox"/> Infrast. Eng.			
<input type="checkbox"/> Civil Eng.			
<input type="checkbox"/> Elect. Eng.			

Date/Time of Inspection : 6/6/2020

7. ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :

تقدمت الشركة (0.79/ك) بالطلب على زيارة الموقع - إعادة الترخيص  
 التي تم منحها رقم (5) على خطة العمل - بقولنا إننا لم نضرب الخندق

The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature \_\_\_\_\_ DATE : 6/6/2020



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
( دائرة الحركة والتحميل )  
إجازة مرور و سند تحميل

رقم العمولة: 12215875 التاريخ: 06/06/2020  
المادة: اسفلت سائب أم سي 70  
الوزن القائم: 20770 كغم  
الوزن الفارغ: 10300 كغم  
الوزن الصافي: 10470 كغم  
الكثافة لي الهواء على 15°م: 966.9256  
رقم الخزان: 193  
رقم الشهادة: 208  
رقم الصهرج: 6034892  
أرقام الأختام: 1841839

للكثافة في الفراغ على 15°م: 968.0000

نوع الحمولة: حمولة سائبة بسيارات العميل  
عدد البراميل:

اسم الناقل: العميل نفسه / شركة ورقة عبد الرحمن أسعد السقا

رقم العميل	رقم الشحنة	رقم العميل	الكمية	وحدة
2336232	6826373	7493	11000	كجم

مكتب النموذج: محمد يوسف احمد شلتش  
مسبب اعد المكتب: سمود سلمان محمد محمد

عامل/مراقب التحميل: مالك احمد محمد بني سعيد  
رقم السق: 9491011238 / 99000215

عامل التعبئة: عواد حمدان عواد عليماث  
عامل مراقبة التفريغ: عادل عبد الله خلف مشاقبه

مأمور القبان للفراغ: احمد محمد مفلح دويكات  
مراقب بوابة الدخول: عصام صديقي عبدالرحيم ابوترابه

مأمور القبان للتحميل: عدنان احمد محمد عكور

08:06:51 06/06/2020

نسخة الناقل

Handwritten signature and stamp

<b>Project No. : 17/2020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (Back to Back اوله الثاني) الجزء الثاني	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> 51
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المحددة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 8/16/2020

**REQUEST FOR INSPECTION**

We request your attendance to inspect the following works :

1. TYPE :  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. INSPECTION TIME : \_\_\_\_\_ DATE : 1 / 1

3. LOCATION :	Zone	Road	Stations/Nodes	Drawing No.
		0+400 →	0+500	16

4. INSPECTION :  First  Second  Third

5. PURPOSE OF THE INSPECTION :

<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat <input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Civil Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
---	---	---	--

Others (specify) please check spraying prime coat (Mkfi)

Particular Details \_\_\_\_\_

Submitted by : Eng. Adulk Signature \_\_\_\_\_

6. INSPECTION REPORT :

<input type="checkbox"/> Surveyor		Date/Time of Inspection : 8/16/2020
<input type="checkbox"/> Mat. Eng.		
<input type="checkbox"/> Infrast. Eng.		
<input type="checkbox"/> CIVIL Eng.	0+400 - 0+500 (LSS → R30)	
<input type="checkbox"/> Elect. Eng.	8+500 - 560 (LSS - L30)	

**SIGNATURE:**

7. ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :

المراجعة على أساس لائحة المواصفات المعمول بها في سورية (م. 79/19/2010) والنتيجة هي كالتالي:

The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature \_\_\_\_\_ DATE : 8/16/2020

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

JORDAN PETROLEUM REFINERY  
CO. LTD. ZERKA - JORDAN

Date التاريخ 08/06/2020 Time In س. الدخول 02:44 PM TK. No. رقم الصهريج 42849		بطاقة قبان رقم In Scale (4) No 307421 GROSS WT (KG) الوزن الكلي (كجم) 27580 TARE WT (KG) الوزن الفرج (كجم) 11860 kg Net WT (KG) الوزن الصافي	
Date التاريخ 08/06/2020 Time Out س. الخروج 15:07 TK. No. رقم الصهريج 42849		(Signature) رقم القبان رقم الصهريج رقم الحموله نوع المادة المصهجة / الفرقة TYPE OF PRODUCT 62807	



شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة

JORDAN PETROLEUM REFINERY  
CO. LTD. ZERKA - JORDAN

Date التاريخ 08/06/2020 Time in. من المدخل 02:44 PM TK. No. رقم الصوبج 42848		بطاقة قبان رقم In Scale (4) No 307421 GROSS WT (KG) الوزن الكلي (كجم) 21580	
Date التاريخ 08/08/2020 Time Out من المخرج 15:07 TK. No. رقم الصوبج 42848		TARE WT (KG) الوزن الفارغ (كجم) 11860 kg Net WT (KG) الوزن الصافي (كجم)	
رقم الآ	اسم العميل / رقم الصوبج	رقم القبان	اسم العميل / رقم الصوبج
رقم الصوبج LOADING/UNLOADING ORDER		اسم المادة المتصلة / القرفة TYPE OF PRODUCT	
658277		المادة المتصلة	

Engineer



المكتب الهندسي الاستشاري



Contractor



شركة المشاريع المتحدة

تنفيذ مساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري

(ساحة المنـاولـة Back to Back)

CENTRAL TENDER NO. 17/2020

Rate of Application / (Prime Coat) Tack Coat, CSS-1) ASTM D-2027, ASTM D- 977						
						Date: 8/6/2020
						IR NO: 51,52
Location	: From station 0+400 to station 0+500 L.H.S					
Station	: From station 0+500 to station 0+560 - 30 = 56					
Material	: <u>HC-70</u> From station 0+400 to station 0+500 R.H.S. & E from 30					
Sample No.		①	②	③	4	5
Location						
Plates No.						
Weight of Plate, kg	A	0.366	0.191	0.309		
Weight of Bitumen and Plate, kg	B	0.437	0.262	0.381		
Weight of Bitumen, kg	C = B - A	0.071	0.071	0.072		
Area of Plate, $\text{m}^2$	D	0.09	0.09	0.09		
Rate of Bitumen, $\text{kg}/\text{m}^2$	E = C/D	0.79	0.79	0.80		
Average Rate of Application, $\text{kg}/\text{m}^2$	F	0.79				
Remarks:	sample passed					
Contractor	Yousef Alzibdeh					
CONSULTANT						

<b>Project No. : 17/2020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (Back to Back) أولية _____ الجزء الثاني	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> '59'
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 10/6/2020




**REQUEST FOR INSPECTION**




We request your attendance to inspect the following works :

1. TYPE :  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. INSPECTION TIME : \_\_\_\_\_ DATE : 1 / 1

3. LOCATION : Zone \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Stations/Nodes \_\_\_\_\_ Drawing No. \_\_\_\_\_  
 0+400 → 0+500 RT from 30 → 5'5"  
 0+300 → 0+330 to RT sampling in Area

4. INSPECTION :  First  Second  Third

**5. PURPOSE OF THE INSPECTION :**


<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat <input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Pavng & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Civil Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
--	---	---	--

Others (specify) please check spraying prime coat

Particular Details (MC 70)

Submitted by : Eng. Malik Signature \_\_\_\_\_

**6. INSPECTION REPORT :**

<input type="checkbox"/> Surveyor <input checked="" type="checkbox"/> Mat. Eng. <input type="checkbox"/> Infrast. Eng. <input type="checkbox"/> Civil Eng. <input type="checkbox"/> Elect. Eng.	(0+400 - 0+500 (R30 - R55)) (at 400 - 500)	<b>SIGNATURE:</b> 
---	---	--

Date/Time of Inspection : 10/6/2020

**7. ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :**

تتمه نسبة الرطوبة كما تمه (0.88 Kg/m<sup>2</sup>) لنسبة الرطوبة 0.61

The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature \_\_\_\_\_ DATE : 10/6/2020

Engineer



المكتب الهندسي الاستشاري



Contractor



شركة المشاريع المتحدة

تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري

(ساحة المناولة Back to Back)

CENTRAL TENDER NO. 17/2020

Rate of Application / <u>Prime Coat</u> Tack Coat, CSS-1) ASTM D-2027, ASTM D- 977						
						Date: 10/6/2020
						IR NO: 59
Location	: From station 0+400 to 0+500 From B.O. 255 and from					
Station	: 0+300 to station 0+330 R.H.S 20m - and Hunger Area					
Material	: MC-70					
Sample No.		1	2	3	4	5
Location		0+450	0+320	Hunger Area		
Plates No.		A	B	C		
Weight of Plate, kg	A	0.200	0.223	0.228		
Weight of Bitumen and Plate, kg	B	0.2575	0.300	0.294		
Weight of Bitumen, kg	C = B - A	0.0575	0.077	0.066		
Area of Plate, m <sup>2</sup>	D	0.076	0.076	0.076		
Rate of Bitumen, kg / m <sup>2</sup>	E = C / D	0.76	1.01	0.87		
Average Rate of Application, kg / m <sup>2</sup>	F	0.88				
Remarks:	sample passed.					
Contractor			CONSULTANT			
Yousef Al Zibaleh						

IR: 59

شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة  
( دائرة الحركة والتحميل )  
إجازة مرور و سند تحميل

رقم الحمولة: 12216567 التاريخ: 10/06/2020  
المادة: إسفلت سائب ام سي 70  
الكتافة في الهواء على 15م: 966.9257  
رقم الخزان: 193  
رقم الشهادة: 208

رقم الصهريج: 6053405

أرقام الأختام: 6868686868

الكتافة في الفراغ على 15م: 968.0000

نوع الحمولة: حمولة سائبة بسيارات العميل  
عدد البراميل:

اسم الناقل: العميل نفسه / شركة ورثة عبد الرحمن اسمعيل

رقم العميل	رقم الشحنة	رقم العميل	اسم العميل	الكمية	وحدة القياس
7610	6828217	2336232	التلال الطبيعي والمشاريع والاتي	5000	مكعبات

مكتب النموذج: ياسر محمد صالح التوقا  
مكتب المراجعة: ياسر محمد صالح التوقا  
المسائق المعتمده: محمد جهاد صالح

رقم المساق: 2323307 / 9821050900

عامل/مرقب التحميل: مالك احمد محسن  
عامل التعبئة: محمد محمود محمد  
مأمور القبان للفارغ: مفلح والمثلح فلاح المبروك


مأمور القبان للقائم: احمد محمد مفلح دوكرات

13:21:09 10/06/2020

نسخة الدال

توقيع المستلم

ياسر محمد صالح التوقا

<b>Project No. : 17/2020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المنـاولـة الأولى - الجزء الثاني)	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> 64
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 12/6/2020

**REQUEST FOR INSPECTION**

We request your attendance to inspect the following works :

1. **TYPE :**  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. **INSPECTION TIME :** \_\_\_\_\_ **DATE :** 1 / 1

3. **LOCATION :** Zone \_\_\_\_\_ Road 0+500 → 0+570 Rd Stations/Nodes Left → 30 Drawing No. \_\_\_\_\_

4. **INSPECTION :**  First  Second  Third

5. **PURPOSE OF THE INSPECTION :**

<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat	<input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> CIVIL Works/Finshings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
---	--	---	---	---

Others (specify) please check spraying prime coat (MC70)

Particular Details \_\_\_\_\_

Submitted by: mg matsk Signature [Signature]

6. **INSPECTION REPORT :**

<input type="checkbox"/> Surveyor		<b>SIGNATURE:</b> <u>[Signature]</u> Date/Time of Inspection : 12/6/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Mat. Eng.	<u>Mat. Eng. Supervisor</u>	
<input type="checkbox"/> Infrast. Eng.		
<input type="checkbox"/> Civil Eng.	<u>0+500 - 0+570 (L30 - R55)</u>	
<input type="checkbox"/> Elect. Eng.		

7. **ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :**

العملية على ما مضى (100%) (ملاحظة: 650) (ملاحظة: 650)


The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature [Signature] DATE : 12/6/2020

Engineer



المكتب الهندسي الاستشاري



Contractor



شركة المشاريع المتحدة

تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري

(ساحة المــــا أولة Back to Back)

CENTRAL TENDER NO. 17/2020

Rate of Application / (Prime Coat, Tack Coat, CSS-1) ASTM D-2027, ASTM D- 977

Date: 12/6/2020

IR NO: 64

Location : From station 0+500 to 0+570 R.H.S

Station : \_\_\_\_\_

Material : ME-70

Sample No.		1	2	3	4	5
Location						
Plates No.		A	B	C		
Weight of Plate, kg	A	0.2238	0.228	0.315		
Weight of Bitumen and Plate, kg	B	0.305	0.310	0.380		
Weight of Bitumen, kg	C = B - A	0.0815	0.082			
Area of Plate, m <sup>2</sup>	D	0.076	0.076	0.076		
Rate of Bitumen, kg / m <sup>2</sup>	E = C / D	1.07	1.08	0.86		
Average Rate of Application, kg / m <sup>2</sup>	F	1.00				

Remarks: sample passed.

Contractor

Yousef Alzibdeh

CONSULTANT

AS

<b>Project No. : 1712020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المنـاولـة Back to Back الجزء الثاني)	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> 25
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 13/6/2020




**REQUEST FOR INSPECTION**




We request your attendance to inspect the following works :

1. TYPE :  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. INSPECTION TIME : \_\_\_\_\_ DATE : 1 / 1

3. LOCATION : Zone \_\_\_\_\_ Road 0+288 → 0+570 Stations/Nodes 0+288 → 0+420 R4 Drawing No. trans 4 → 30

4. INSPECTION :  First  Second  Third

5. PURPOSE OF THE INSPECTION :

<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat <input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Civil Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
---	---	---	--

Others (specify) please check laying asphalt wearing  
 Particular Details course layer  
 Submitted by: L.719 Maklak Signature [Signature]

6. INSPECTION REPORT :

<input type="checkbox"/> Surveyor	<u>عبدالله بن عبدالمطلب</u>	SIGNATURE:
<input type="checkbox"/> Mat. Eng.	<u>(0+288 - 0+500)</u>	
<input type="checkbox"/> Infrast. Eng.	<u>(L30 - R10)</u>	
<input type="checkbox"/> Civil Eng.	<u>(0+288 - 0+580)</u>	
<input type="checkbox"/> Elect. Eng.	<u>L10 - R55</u>	

Date/Time of Inspection : 13/6/2020


7. ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :

لا يوجد لمبات في تمام كلفة الارضيات ، واما زينة رص (RC) على الارضيات (0.1 Kg/m<sup>2</sup>)  
والمزينة على الارضيات لم يتم ربطها بالخرق المخرقة

The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature [Signature] DATE : 13/6/2020

Total Area 5733,062 = SQM  
 Deduct Ramp 646,25 = SQM  
 Net Area 5086,812 = SQM

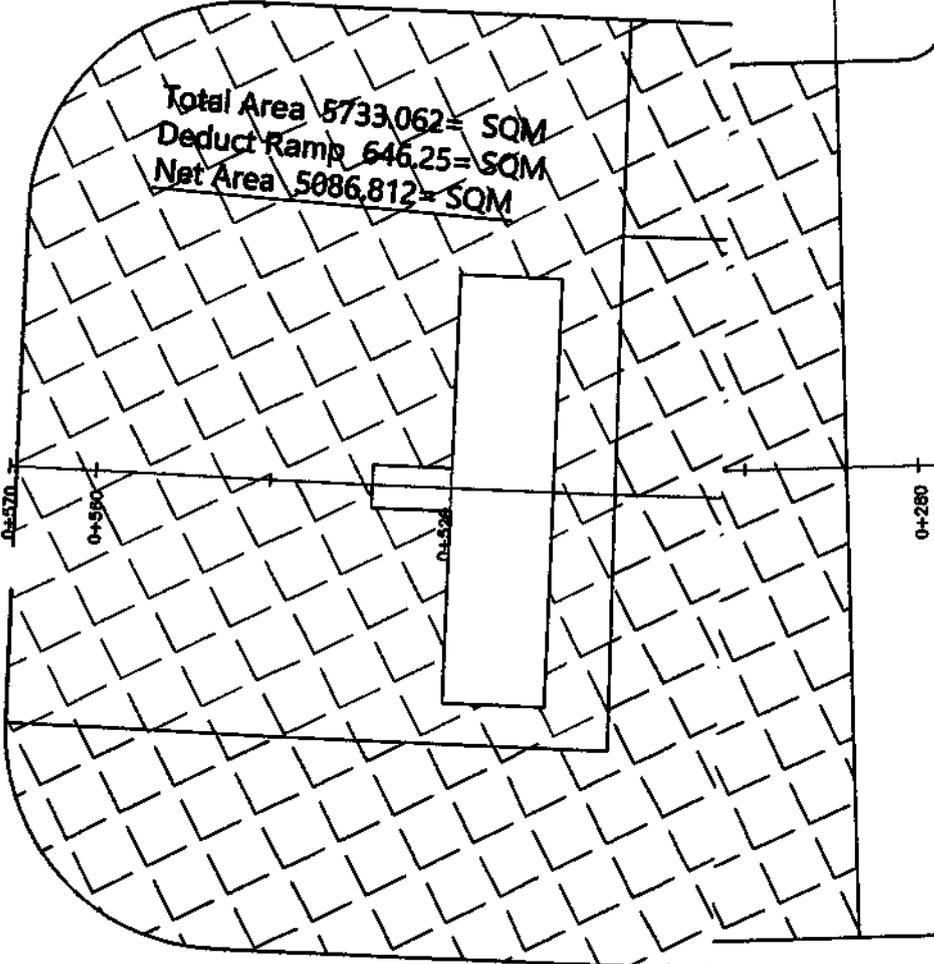

REV.3	
REV.2	
REV.1	28-05-2020

CLIENT: وزارة الاعمال والمدن والإسكان  
 Ministry of Public Works & Housing

اسم المشروع:

**BACK TO BACK YARD  
 AT OMARY BORDER**

CONSULTANT: 

CONTRACTOR: 

Drawing Title:  
**PRIME COAT (MC)**

SCALE : NTS      DATE : 20-06-2020



DESIGNED BY :-

PREPARED BY: SHADI ALKOUZ

CHECKED BY : Eng : MOHAMMAD SAHMOUD

Drawing No. : 01



<b>Project No. : 17/2020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المـاولة ————— الجزء الثاني)	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> "68"
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 14/6/2020




**REQUEST FOR INSPECTION**




We request your attendance to inspect the following works :

1. **TYPE :**  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. **INSPECTION TIME :** \_\_\_\_\_ **DATE :** 1 / 1

<b>LOCATION :</b>	<b>Zone</b>	<b>Road</b>	<b>Stations/Nodes</b>	<b>Drawing No.</b>
		0+380	0+500 Rt	El. 10 - 20

4. **INSPECTION :**  First  Second  Third

5. **PURPOSE OF THE INSPECTION :**

<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat	<input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Civil Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
---	--	---	---	--

Others (specify) please check laying asphalt wearing  
 Particular Details course layer  
 Submitted by: Eng. Mark Signature [Signature]

6. **INSPECTION REPORT :**

<input type="checkbox"/> Surveyor <input type="checkbox"/> Mat. Eng. <input type="checkbox"/> Infrast. Eng. <input type="checkbox"/> Civil Eng. <input type="checkbox"/> Elect. Eng.	C.E. / 2/19 U.E.C. الأمان الهندسة (0+380 - 0+500) L10 → R55	<b>SIGNATURE:</b>  
--	--	---------------------------

Date/Time of Inspection : 14/6/2020


7. **ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :**

لا مانع من البادئة تنفيذ الأعمال كالمعتاد، والملاحظة على الأعمال المنفذة هي (0.1 كغ/م<sup>2</sup>) على اعتبارها للعرضية

The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature [Signature] DATE : 14/6/2020



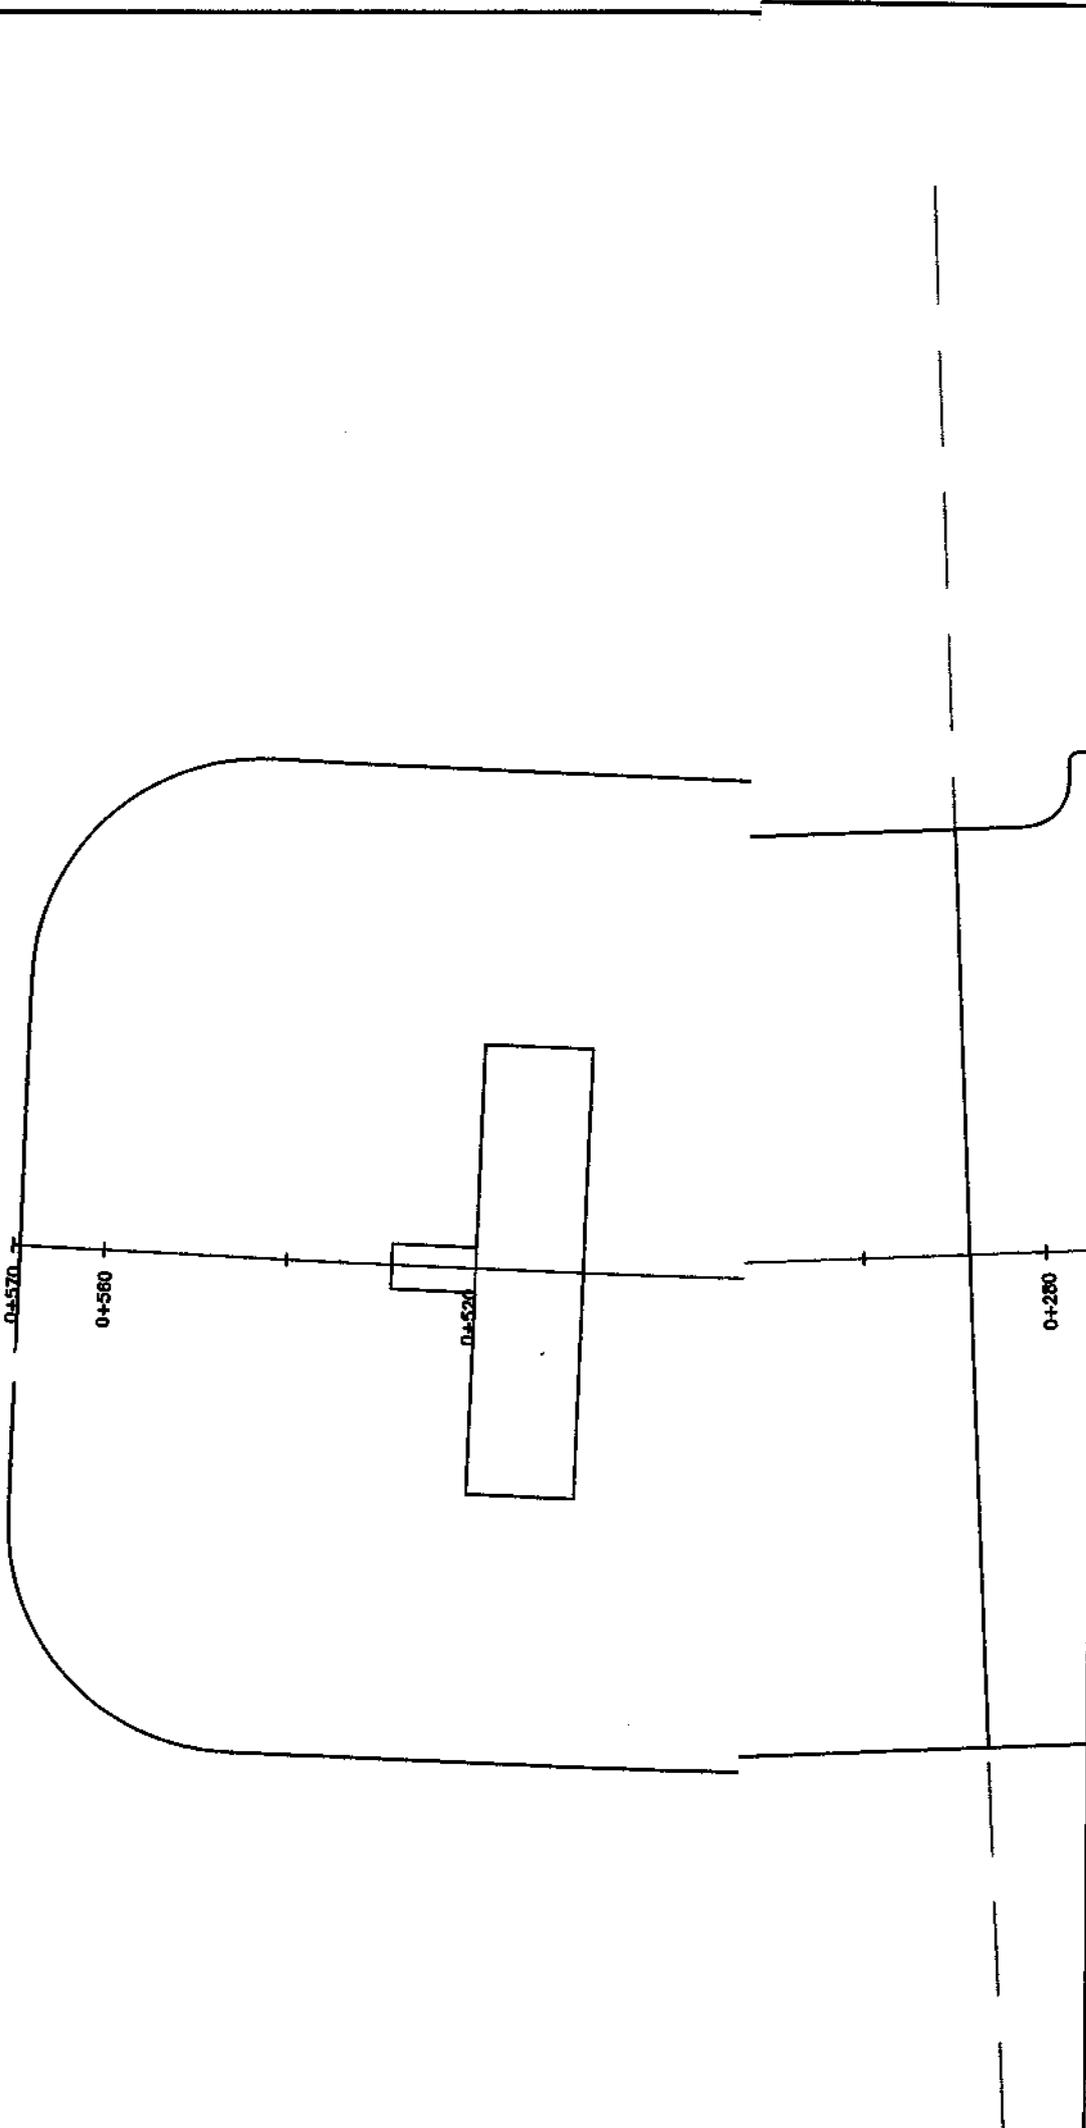

REV.3	
REV.2	
REV.1	29-05-2020

CLIENT: وزارة الأشغال العامة والإسكان  
 Ministry of Public Works & Housing

اسمشيخ

**BACK TO BACK YARD  
 AT OMARY BORDER**

CONSULTANT: 

CONTRACTOR: 

Drawing Title:  
**Asphalt Quantities**

SCALE : NTS      DATE : 29-05-2020

DESIGNED BY :-

PREPARED BY: SHADI ALKOUZ

CHECKED BY : Eng : MOHAMMAD SAHMOUD

Drawing No. : 01



<b>Project No. : 1712020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المد - ساحة العودة - الجزء الثاني)	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> 73
<b>ENGINEER :</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR :</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 16/6/20




**REQUEST FOR INSPECTION**




We request your attendance to inspect the following works :

1. TYPE :  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. INSPECTION TIME : \_\_\_\_\_ DATE : / /

3. LOCATION : Zone \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Stations/Nodes \_\_\_\_\_ Drawing No. \_\_\_\_\_

4. INSPECTION :  First  Second  Third

5. PURPOSE OF THE INSPECTION :

<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime-Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat <input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Grest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> CIVI Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephonic Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
---	---	---	--

Others (specify) Please check Asphalt hump @  
 Particular Details Main Road #3 (Soton)  
 Submitted by : Eng Malik Signature [Signature]

6. INSPECTION REPORT :

<input type="checkbox"/> Surveyor		<b>SIGNATURE:</b>
<input type="checkbox"/> Mat. Eng.		
<input type="checkbox"/> Infrastr. Eng.		
<input type="checkbox"/> CIVI Eng.		
<input type="checkbox"/> Elect. Eng.		

Date/Time of Inspection : / /

7. ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :


The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature \_\_\_\_\_ DATE : / /








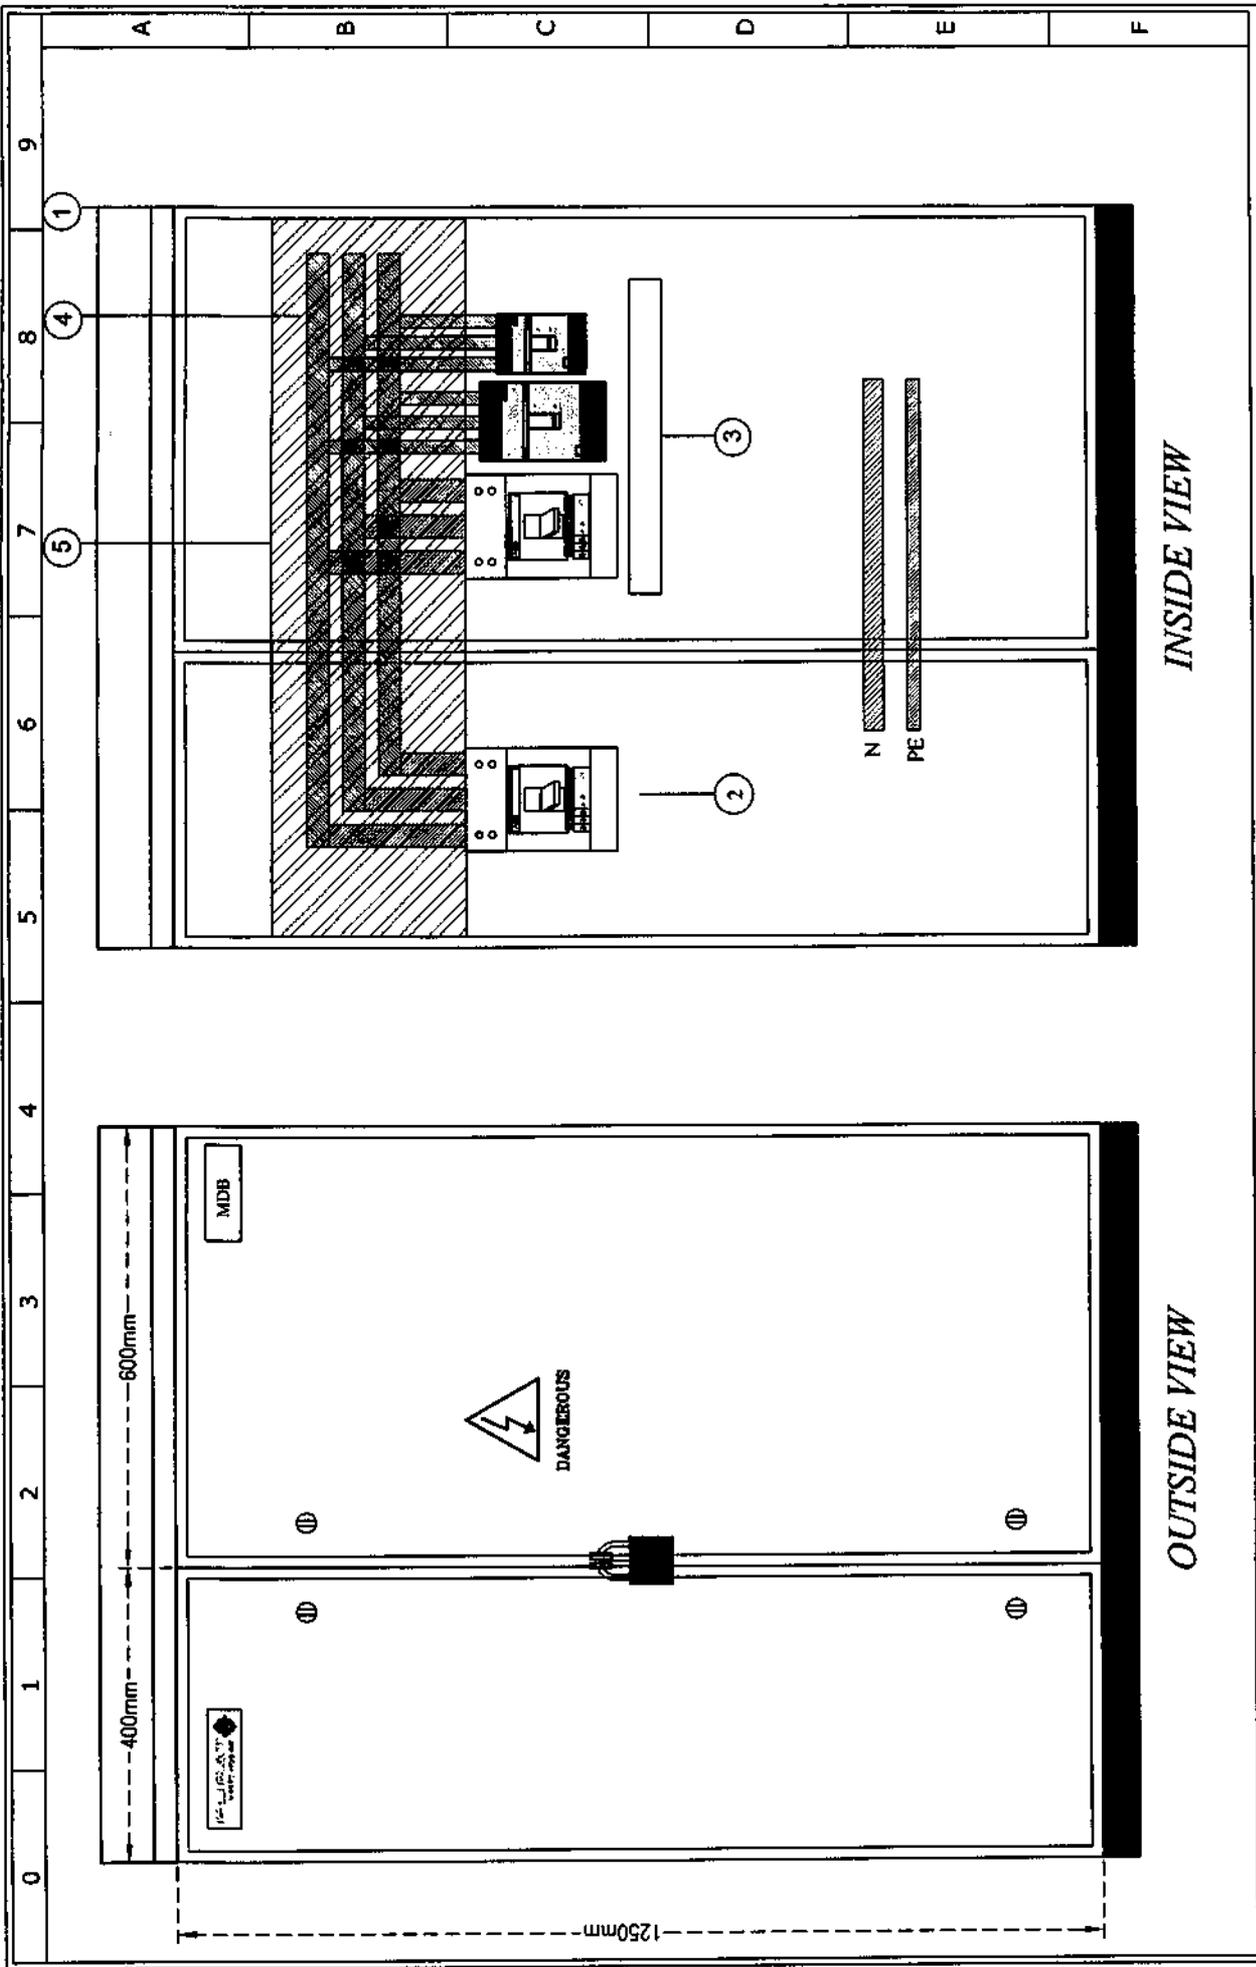


OUTSIDE VIEW

INSIDE VIEW

	TELE : +962 6 489 60 88 FAX : +962 6 489 60 99 www.furatswitchgear.com	PROJECT : OWNER :	CONSULTANT : CONTRACTOR :	PANEL : DESCRIPTION :	MDB Panel LAYOUT	DRAWN BY : CHECKED BY :	B.M.A B.M.A	APPROVED BY : REFERENCE :	S.A.I 0520-261-#F	Date 30.05.2020	PAGE 1/4
--	--	----------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------	----------------	------------------------------	----------------------	--------------------	-------------

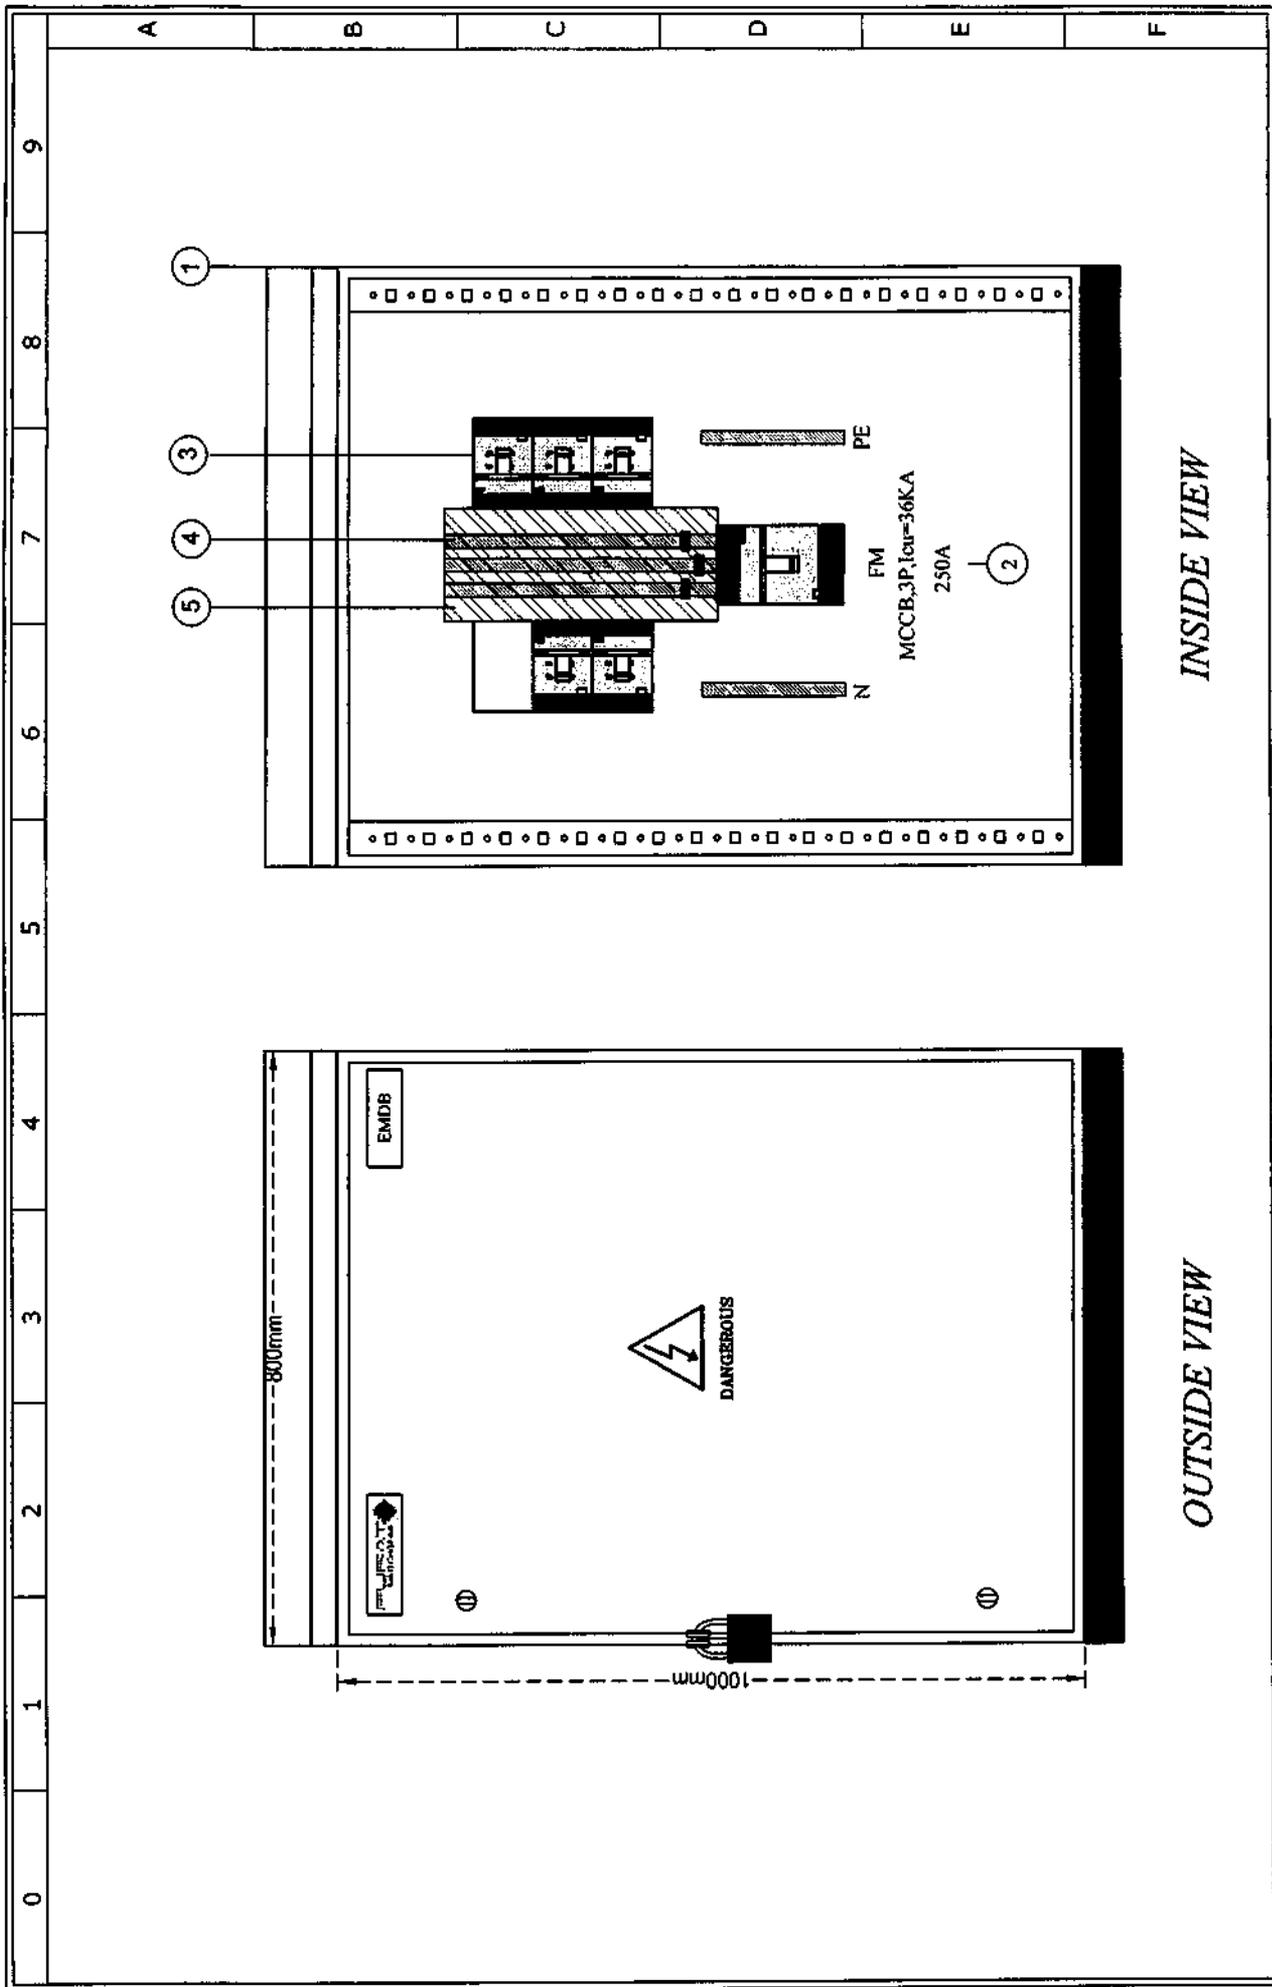

		TELE: +962 6 489 60 88 FAX : +962 6 489 60 99 www.furatswitchgear.com	PROJECT: OWNER:	CONSULTANT: CONTRACTOR:	Delma Co.	PANEL: EMDB Panel DESCRIPTION: LAYOUT	DRAWN BY: B.M.A CHECKED BY: B.M.A	APPROVED BY: S.A.I REFERENCE: 0520-261-MF	Date: 30.05.2020 PAGE: 1/4
--	--	---	--------------------	----------------------------	-----------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------

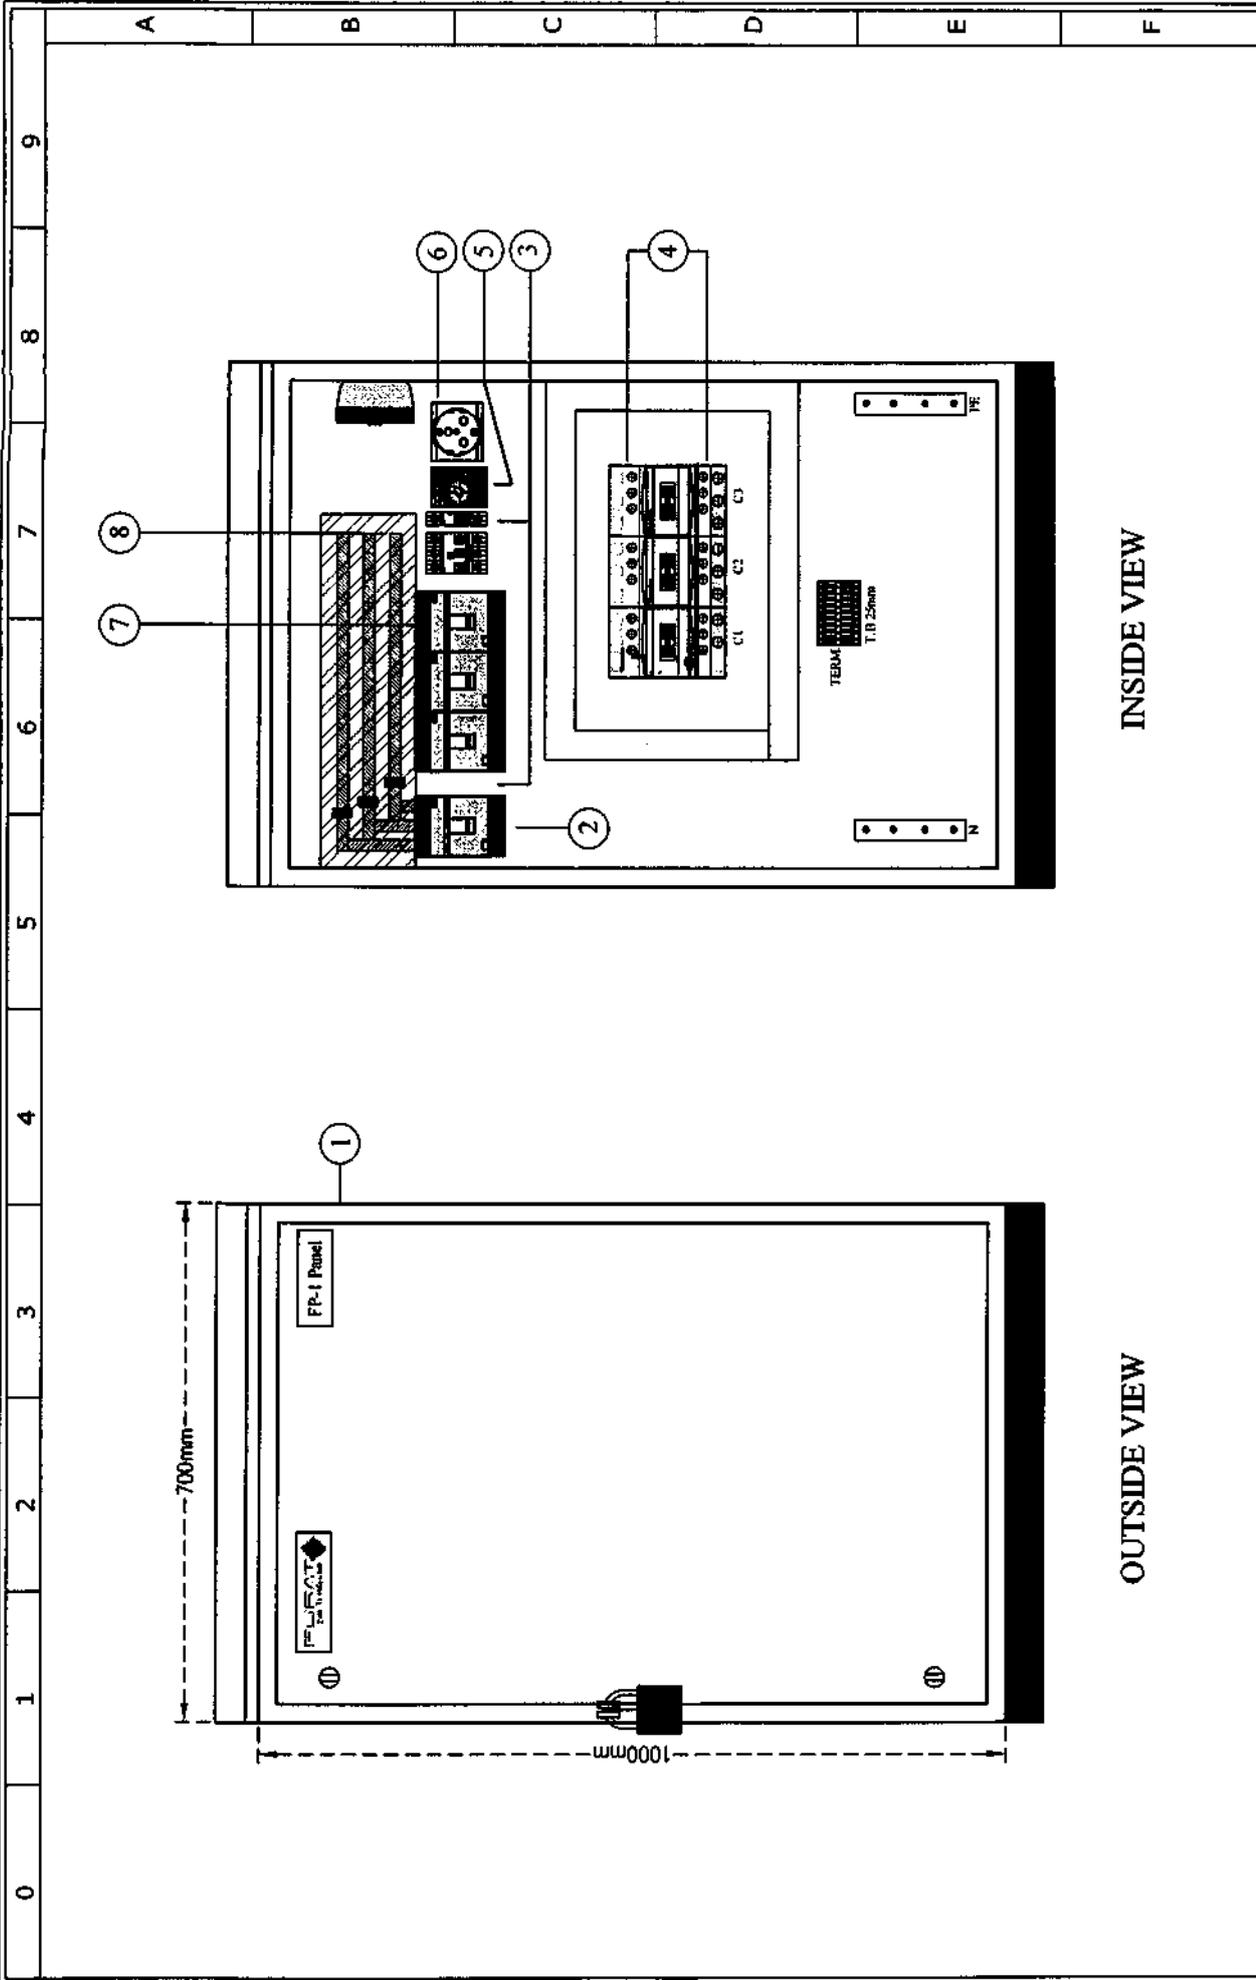

TELE: +962 6 489 60 88 FAX: +962 6 489 60 99 www.furatswitchgear.com	PROJECT: <i>شركة</i>	CONSULTANT: Delma Co.	PANEL: FP-1 Panel	DRAWN BY: B.M.A	APPROVED BY: S.A.I	Date: 30.05.2020	PAGE: 1/5
OWNER:	CONTRACTOR: Delma Co.	DESCRIPTION: LAYOUT	CHECKED BY: B.M.A	REFERENCE: 0520-261-41F			



**Calculation Sheet**

Ministry of Public Works and Housing Project Name : Back to Back yard at Omary Border ( Section 2 ) Project No. 17/2020	<b>Payment No. 1</b>  <b>BILL NO.6</b>	Engineer : Associated Consulting  Contractor : United Enterprises Co.
---	--	---

**BILL NO.6 LIGHTING, TRAFFIC SIGNALS AND ELECTRICAL INSTALLATION**  
**CABLE AND ACCESSORIES ( 4x35 )** Item No. 6.12(1.b)

No.	Location		Cable No.		Length ( m )	Notes
	From	To	Starting	Ending		
<b>For Highmast Lighting</b>						
1	F.P - 1	H.M.6	1,348	1,523	175.000	
<b>For Isolator</b>						
1	Isolator 1	Isolator 2	763	970	207.000	
2	Isolator 2	Isolator 3	970	1,219	249.000	
3	Isolator 3	MDB	1,219	1,348	129.000	
4	MDB	F.P - 1			7.000	
<b>Total Length</b>					<b>767.000</b>	

Contractor  


  
 Consultant



<b>Project No. : 1712020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المدخل - أولية Back to Back) الجزء الثاني	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> 8-5
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Association Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 10/6/2020

**REQUEST FOR INSPECTION**

We request your attendance to inspect the following works :

1. TYPE :  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. INSPECTION TIME : \_\_\_\_\_ DATE : / /

LOCATION :	Zone	Road	Stations/Nodes	Drawing No.

4. INSPECTION :  First  Second  Third

5. PURPOSE OF THE INSPECTION :

<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat <input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input checked="" type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Civil Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
--	---	---	--

Others (specify) Please check cable installation between H.M.9  
 Particular Details -10 as per attached sheet and drawing.

Submitted by : M. SAHMOUD Signature \_\_\_\_\_

6. INSPECTION REPORT :

<input type="checkbox"/> Surveyor		<b>SIGNATURE:</b>
<input type="checkbox"/> Mat. Eng.		
<input type="checkbox"/> Infrast. Eng.		
<input type="checkbox"/> Civil Eng.		
<input type="checkbox"/> Elect. Eng.		

Date/Time of Inspection : 10/6/2020

7. ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :

المراد على الكبرياء مطابقة للبيروت المرسومة، ولذا فإن الموضع تقريبا مستقيم، ويمكن العودة للمراجعات من قبل المهندس  
 وتم عمل التوقيع بواسطة المهندس المختص في وزارة الأشغال العامة والإسكان وعلى مسؤوليته الخاصة

The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature \_\_\_\_\_ DATE : 10/6/2020



<b>Project No. : 17/2020</b> تنفيذ مساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمرى (Sاحة المنى - ساحة Back to Back الجزء الثاني)	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b>  <b>E-4</b>
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 8/16/2020


**REQUEST FOR INSPECTION**

We request your attendance to inspect the following works :

1. TYPE :  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. INSPECTION TIME : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LOCATION :	Zone	Road	Stations/Nodes	Drawing No.
------------	------	------	----------------	-------------

4. INSPECTION :  First  Second  Third

5. PURPOSE OF THE INSPECTION :

<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat <input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tiling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Civil Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
---	---	---	--

Others (specify) Please check cable installation for High mast  
 Particular Details Lighting as per attached sheets and drawing.

Submitted by : M. SPANMOOD Signature \_\_\_\_\_

6. INSPECTION REPORT :

<input type="checkbox"/> Surveyor <input type="checkbox"/> Mat. Eng. <input type="checkbox"/> Infrast. Eng. <input type="checkbox"/> Civil Eng. <input type="checkbox"/> Elect. Eng.	الزمارة على شكل متابعة للجهة المعنية ولنايات الموقع لتتبع أعمال التركيب الواردة بالمراسلات من المهندسين	<b>SIGNATURE:</b> 
--	---	--

Date/Time of Inspection : 8/16/2020

7. ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :

تم عمل توصلة "Joint" جهة المصدر من المرح (9) و (10) على مستوى المأدود رجه لتتعام  
 مع المهندسين من وزارة الأشغال العامة والإسكان مع المهندسين من المرح (9) و (10) على مستوى المأدود رجه لتتعام  
 مع المهندسين من وزارة الأشغال العامة والإسكان مع المهندسين من المرح (9) و (10) على مستوى المأدود رجه لتتعام

The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature \_\_\_\_\_ DATE : 8/16/2020



**ENGINEER**



المكتب الهندسي الاستشاري  
Associated Consulting Engineers

تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري  
(ساحة المناولة Back to Back)

CONTRACT NO. 2  
CENTRAL TENDER NO. 17/2020

**CONTRACTOR**



شركة المشاريع المتحدة  
UNITED ENTERPRISES CO.

For high mast lighting

**CABLES QUANTITIES**

Location: as attached.

Date: 8/6/2020

Cable Size: 6x12.5 mm<sup>2</sup>

From	To	Starting	Ending	Main Cable Length
H.M. 6	H.M. 7	1347 ✓	1492 ✓	145
H.M. 7	H.M. 8	1492 ✓	1657 ✓	165
H.M. 8	H.M. 9	1657 ✓	1839 ✓	182
H.M. 9	H.M. 10	1839 ✓	1975 ✓	136 * cable
Total length		H.M. 10 قبل تجهيزه من كبريتا		628

المراد ان كل اللوازل حطانية للورد، ولطابقا لرفع مقاس  
الكبل العارضة في المواضع هذا المقصود.

Contractor Rep.

الكبل لخوازل بين برج الإنارة رقم (9) و (10)  
لم يصل للبرج رقم (10) قبل بح قدر كبريتا، و أقام لقطار  
لانه لا يتاح له من الجوانب لوزنة لإسقاط على كبريتا.

Consultant Rep.



<b>Project No. : 17/2020</b> تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المنبأولة - الجزء الثاني)	<b>EMPLOYER:</b>  وزارة الأشغال العامة والإسكان	<b>Request No.</b> 5-2
<b>ENGINEER:</b>  المكتب الهندسي الاستشاري Associated Consulting Engineers	<b>CONTRACTOR:</b>  شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة United Enterprises Company - General Contracting	<b>Date</b> 1/16/2020

**REQUEST FOR INSPECTION**

We request your attendance to inspect the following works :

1. TYPE :  Roads  Water  Sewer  Storm Water  Irrigation  Structures  Electrical

2. INSPECTION TIME : \_\_\_\_\_ DATE : / /

3. LOCATION : \_\_\_\_\_ Zone \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Stations/Nodes \_\_\_\_\_ Drawing No. \_\_\_\_\_

4. INSPECTION :  First  Second  Third

5. PURPOSE OF THE INSPECTION :

<b>Roads</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Earthworks <input type="checkbox"/> Sub-grade <input type="checkbox"/> Sub-base <input type="checkbox"/> Prime Coat <input type="checkbox"/> Base Course <input type="checkbox"/> Tack Coat <input type="checkbox"/> Wearing Course <input type="checkbox"/> Kerbs <input type="checkbox"/> Paving & Tilling <input type="checkbox"/> Road Marking <input type="checkbox"/> Road Sign	<b>Infrastructure</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Setting out - Manholes <input type="checkbox"/> Profile - Trench Bottom <input type="checkbox"/> Bedding <input type="checkbox"/> Check Crest of Pipes <input type="checkbox"/> Hydrostatic Test <input type="checkbox"/> Other Tests <input type="checkbox"/> Initial Backfill <input type="checkbox"/> Main Backfill	<b>Structures</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Excav./Shoring <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreting <input type="checkbox"/> Waterproofing <input type="checkbox"/> Joints	<b>Electrical</b> <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Civil Works/Finishings <input type="checkbox"/> MV Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Cables <input type="checkbox"/> Street Lighting Poles <input type="checkbox"/> Light Fittings <input type="checkbox"/> Telephone Duct Bank <input type="checkbox"/> Telephone Cables <input type="checkbox"/> Traffic Signal
--	---	---	--

Others (specify) Please check cable installation as per attached sheet and drawing for High mast lighting and Isolator

Submitted by : M. SAHMOUD Signature \_\_\_\_\_

6. INSPECTION REPORT :

<input type="checkbox"/> Surveyor		<b>SIGNATURE:</b>
<input type="checkbox"/> Mat. Eng.		
<input type="checkbox"/> Infrast. Eng.		
<input type="checkbox"/> Civil Eng.		
<input type="checkbox"/> Elect. Eng.		

Date/Time of Inspection : 1/16/2020

7. ENGINEER'S REPRESENTATIVE'S COMMENTS :

القراءات على الكوابل مطابقة لجدول المرفقة ، ورفايات الرفع تلتزم أسس الكابل الواردة بالمواصفات بهذا الخصوص.

The works are :  Approved  Approved as Noted  Rejected

Signature \_\_\_\_\_ DATE : 1/16/2020



ENGINEER



المكتب الهندسي الاستشاري  
Associated Consulting Engineers

تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري  
(ساحة المناولة Back to Back)

CONTRACT NO. 2  
CENTRAL TENDER NO. 17/2020

CONTRACTOR



شركة المشاريع المتحدة  
UNITED ENTERPRISES CO.

\* for High Mast.

CABLES QUANTITIES

Location: as attached DWG

Date: / 16 / 2020

Cable Size: 4x25 mm<sup>2</sup>

From	To	Starting	Ending	Main Cable Length
H.M-01	H.M-02	755	875	120 M
H.M-02	H.M-03	875	1005	130 M
H.M-03	H.M-04	1005	1124	119 M
H.M-04	H.M-05	1124	1256	132
H.M-05	F.P-01	1256	1347	91 M
total length				592 M

Contractor Rep.

القراءات على الكوابل مطابقة للجدول، والكمية حسب المواصفات لقيام الرضع.

Consultant Rep.











